


ID	Nome da tarefa	Duration	Start	Finish	Custo total	August
1	Projeto Piloto Vídeo Tutorial - MS Outlook	130 days	Mon 02/08/10	Mon 07/02/11	R\$ 23.628,67	
2	Realizar Pesquisa Preliminar	11 days	Mon 02/08/10	Mon 16/08/10	R\$ 1.820,67	
3	Definir escopo de pesquisa	2 days	Mon 02/08/10	Tue 03/08/10	R\$ 530,67	
4	Definir amostragem de pesquisa	1 day	Wed 04/08/10	Wed 04/08/10	R\$ 392,00	
5	Aplicar pesquisa	7 days	Thu 05/08/10	Fri 13/08/10	R\$ 266,00	
6	Tabular e analisar resultados	1 day	Mon 16/08/10	Mon 16/08/10	R\$ 632,00	
7	Preparar plano de curso	5 days	Tue 17/08/10	Mon 23/08/10	R\$ 1.144,00	
8	Definir objetivos, carga horária, recursos, preparar plano	4 days	Tue 17/08/10	Fri 20/08/10	R\$ 992,00	
9	Definir avaliação de aprendizagem	1 day	Mon 23/08/10	Mon 23/08/10	R\$ 152,00	
10	Preparar Conteúdo	42 days	Mon 23/08/10	Fri 22/10/10	R\$ 8.064,00	
11	Assinar termo de cessão de direitos autorais	0 days	Mon 23/08/10	Mon 23/08/10	R\$ 0,00	
12	Preparar apostila	10 days	Tue 24/08/10	Mon 06/09/10	R\$ 1.760,00	
13	Preparar Script de gravação	10 days	Tue 31/08/10	Tue 14/09/10	R\$ 1.760,00	
14	Preparar Vídeo Tutorial	27 days	Wed 15/09/10	Fri 22/10/10	R\$ 4.544,00	
15	Preparar projeções de tela "Camtasia Studio"	10 days	Wed 15/09/10	Tue 28/09/10	R\$ 1.760,00	
16	Definir Narrador	1 day	Wed 15/09/10	Wed 15/09/10	R\$ 248,00	
17	Assinar termo de cessão de uso de imagem	0 days	Wed 15/09/10	Wed 15/09/10	R\$ 0,00	
18	Gravar narração	10 days	Wed 29/09/10	Wed 13/10/10	R\$ 1.000,00	
19	Revisar edição de vídeo	5 days	Wed 13/10/10	Wed 20/10/10	R\$ 880,00	
20	Testar vídeo	2 days	Wed 20/10/10	Fri 22/10/10	R\$ 656,00	
21	Contratar Instrutor	2 days	Mon 25/10/10	Tue 26/10/10	R\$ 304,00	
22	Contactar possíveis Instrutores	2 days	Mon 25/10/10	Tue 26/10/10	R\$ 304,00	
23	Formalizar compromisso para realização de tutoria interna	0 days	Tue 26/10/10	Tue 26/10/10	R\$ 0,00	
24	Preparar Curso	15 days	Wed 27/10/10	Thu 18/11/10	R\$ 4.172,00	
25	Analisar índice e distribuir tópicos em unidades	4 days	Wed 27/10/10	Mon 01/11/10	R\$ 1.280,00	
26	Submeter curso à aprovação da UCS	1 day	Wed 03/11/10	Wed 03/11/10	R\$ 152,00	
27	Efetuar lançamento das unidades no AVA	5 days	Thu 04/11/10	Wed 10/11/10	R\$ 760,00	
28	Validar lançamentos da unidades no AVA	10 days	Thu 04/11/10	Thu 18/11/10	R\$ 1.980,00	
29	Formação Turma Piloto	4 days	Fri 19/11/10	Wed 24/11/10	R\$ 608,00	
30	Selecionar alunos	2 days	Fri 19/11/10	Mon 22/11/10	R\$ 304,00	

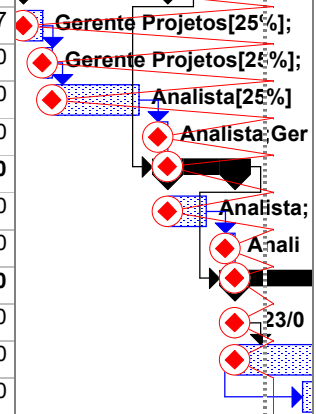


Projeto: Proj_Video_Tutorial_PDC
Data: Fri 27/08/10

Tarefa		Tarefa acumulada		Tarefas externas	
Andamento		Etapa acumulada		Resumo do projeto	
Etapa		Andamento acumulado		Agrupar por resumo	
Resumo		Divisão		Prazo final	


ID	Nome da tarefa	Duration	Start	Finish	Custo total	August
31	Cadastrar alunos no AVA e fornecer senha de acesso	2 days	Tue 23/11/10	Wed 24/11/10	R\$ 304,00	
32	Disponibilizar Curso no AVA	1 day	Thu 25/11/10	Thu 25/11/10	R\$ 38,00	
33	Acompanhar andamento Curso Piloto	33 days	Fri 26/11/10	Thu 13/01/11	R\$ 3.894,00	
34	Tutoria - Parte 1	10 days	Fri 26/11/10	Thu 09/12/10	R\$ 800,00	
35	Aplicar Exercícios de Fixação 1	1 day	Fri 10/12/10	Fri 10/12/10	R\$ 118,00	
36	Tutoria - Parte 2	10 days	Mon 13/12/10	Mon 27/12/10	R\$ 800,00	
37	Aplicar Exercícios de Fixação 2	1 day	Tue 28/12/10	Tue 28/12/10	R\$ 118,00	
38	Tutoria - Parte 3	10 days	Wed 29/12/10	Wed 12/01/11	R\$ 800,00	
39	Aplicar Avaliação Final	1 day	Thu 13/01/11	Thu 13/01/11	R\$ 118,00	
40	Efetuar análise de relatórios de acesso (Acompanham.)	30 days	Fri 26/11/10	Mon 10/01/11	R\$ 1.140,00	
41	Realizar Pesquisa Satisfação	8 days	Fri 14/01/11	Tue 25/01/11	R\$ 1.568,00	
42	Definir escopo de pesquisa	2 days	Fri 14/01/11	Mon 17/01/11	R\$ 556,00	
43	Aplicar pesquisa	5 days	Tue 18/01/11	Mon 24/01/11	R\$ 380,00	
44	Tabular e analisar resultados	1 day	Tue 25/01/11	Tue 25/01/11	R\$ 632,00	
45	Ajustar Conteúdo e Curso	5 days	Wed 26/01/11	Tue 01/02/11	R\$ 1.040,00	
46	Divulgação Geral do Curso para a Sefaz	2 days	Wed 02/02/11	Thu 03/02/11	R\$ 480,00	
47	Preparar Banner e disponibilizar na Intranet	2 days	Wed 02/02/11	Thu 03/02/11	R\$ 320,00	
48	Enviar comunicadio da Ascom via email	1 day	Wed 02/02/11	Wed 02/02/11	R\$ 160,00	
49	Emitir Relatório Final - Conclusão	2 days	Fri 04/02/11	Mon 07/02/11	R\$ 496,00	

Projeto: Proj_Video_Tutorial_PDC
Data: Fri 27/08/10

Tarefa



Tarefa acumulada



Tarefas externas



Andamento



Etapa acumulada



Resumo do projeto



Etapa



Andamento acumulado



Agrupar por resumo



Resumo




Divisão




Prazo final



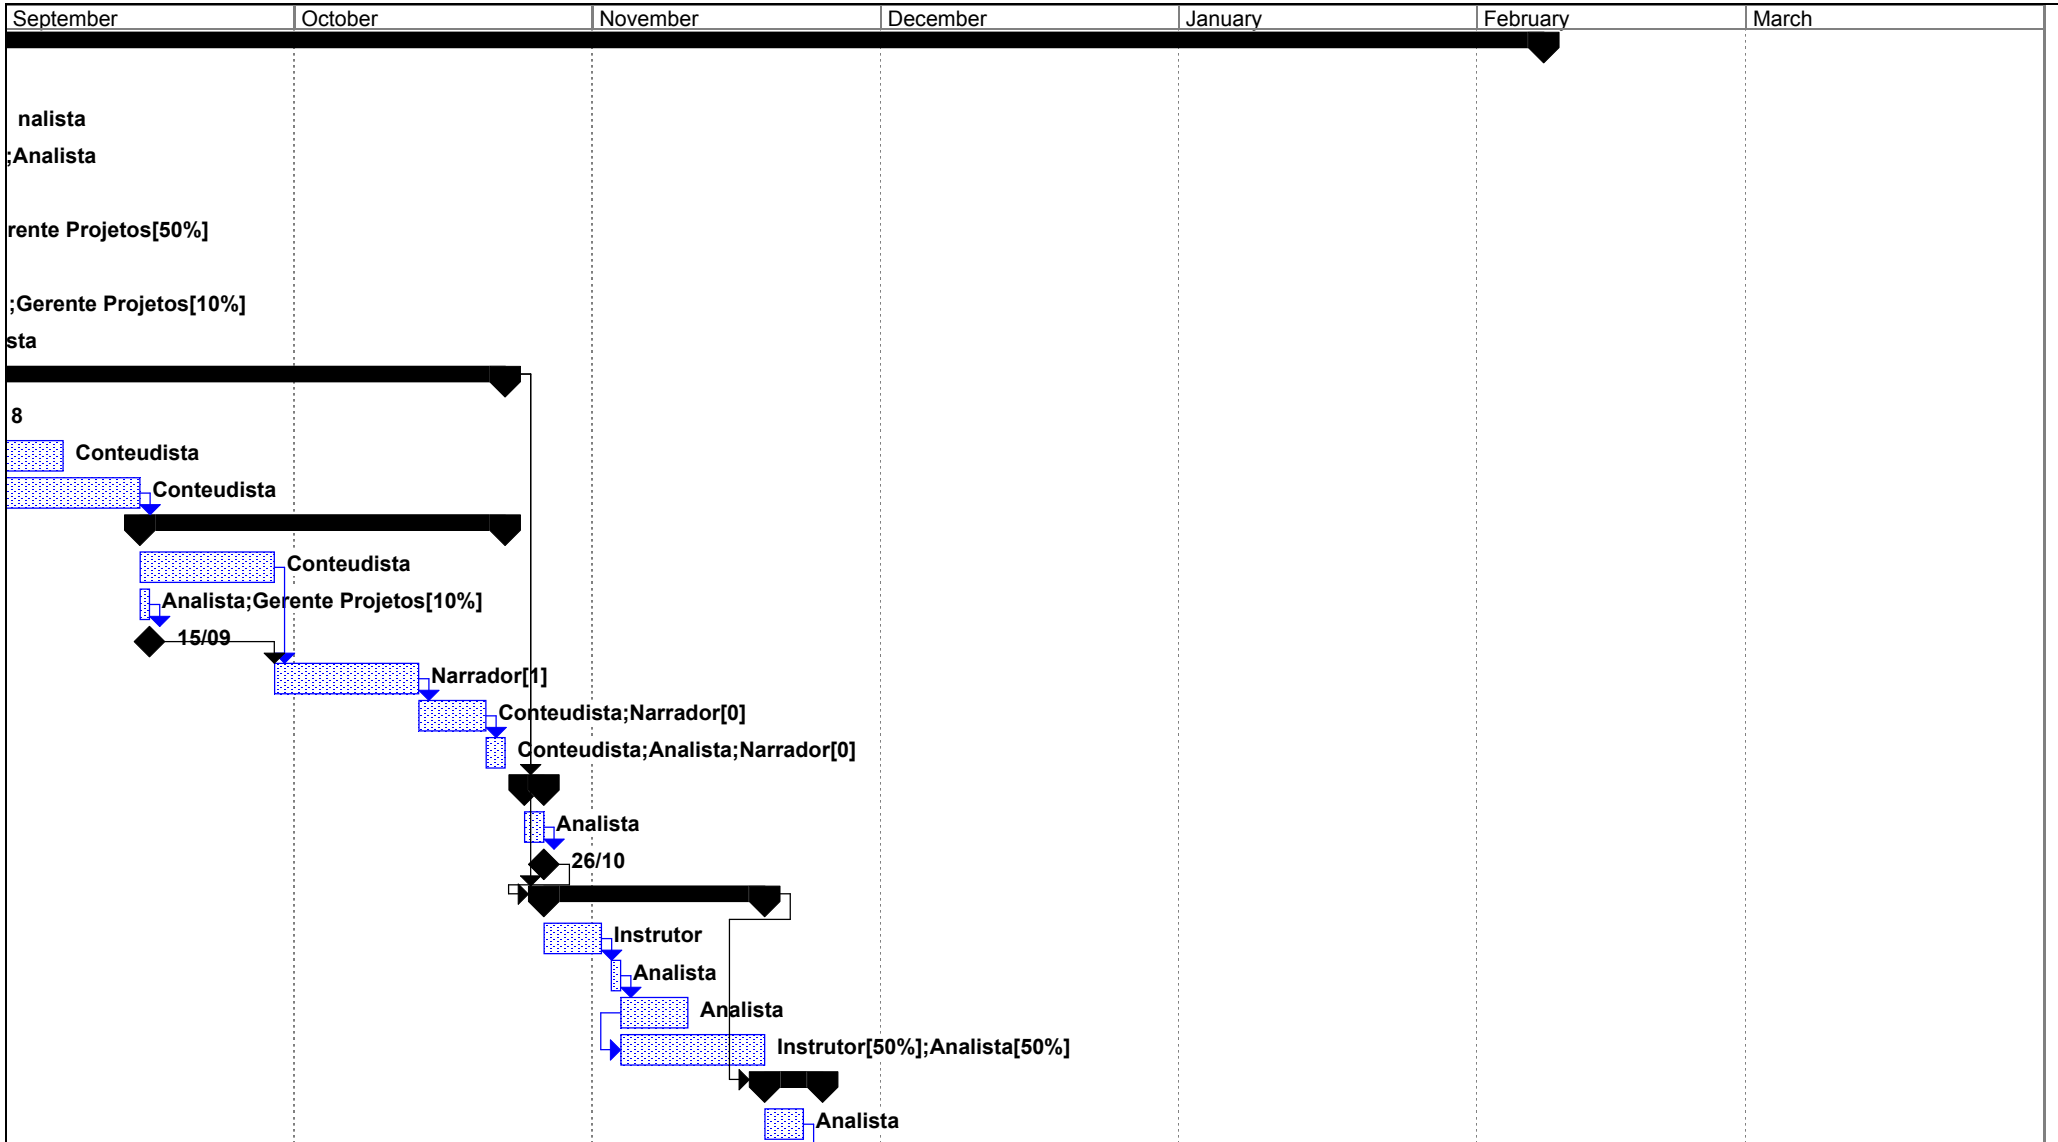

Projeto: Proj_Video_Tutorial_PDC Data: Fri 27/08/10	Tarefa		Tarefa acumulada		Tarefas externas	
	Andamento		Etapa acumulada		Resumo do projeto	
	Etapa		Andamento acumulado		Agrupar por resumo	
	Resumo		Divisão		Prazo final	

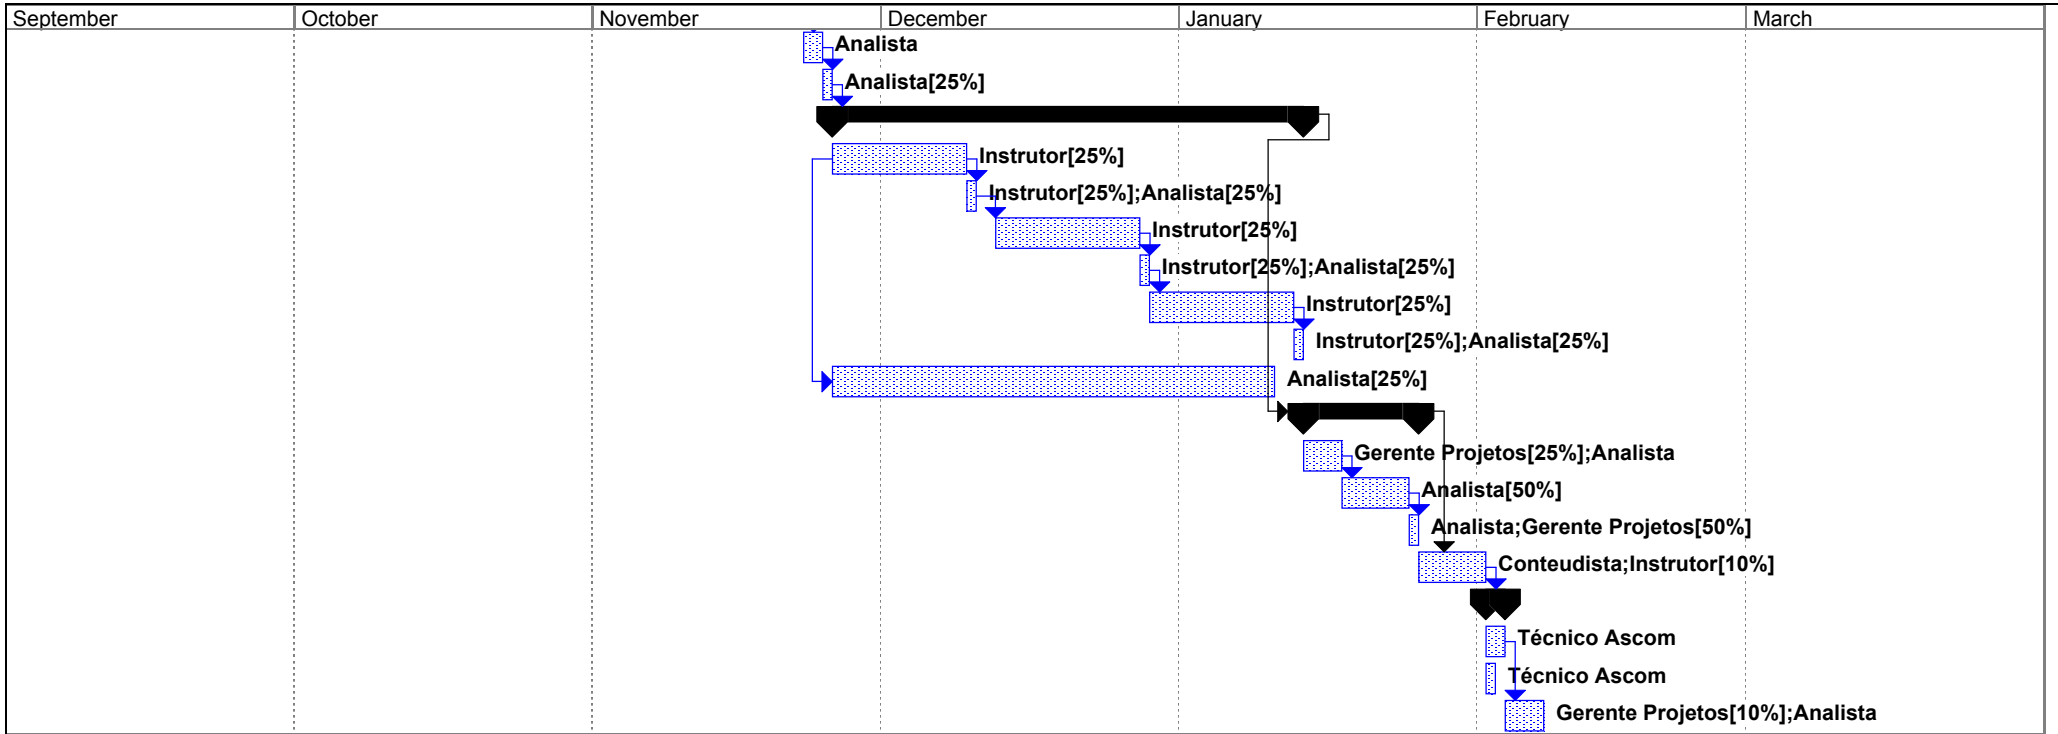

Projeto: Proj_Video_Tutorial_PDC Data: Fri 27/08/10	Tarefa		Tarefa acumulada		Tarefas externas	
	Andamento		Etapa acumulada		Resumo do projeto	
	Etapa		Andamento acumulado		Agrupar por resumo	
	Resumo		Divisão		Prazo final	
