




ID	Nome da tarefa	Duration	Start	Finish	Status	24 Jun '12						
						S	M	T	W	T	F	
1	FASE 01 – Levantamento e detalhamento dos direcionadores estratégicos e táticos a s	21 days?	Mon 25/06/12	Mon 23/07/12	Complete							
2	P01 - Direcionadores estratégicos identificados	21 days?	Mon 25/06/12	Mon 23/07/12	Complete							
3	P02 - Lista de objetivos estratégicos e táticos, com suas respectivas justificativas	21 days?	Mon 25/06/12	Mon 23/07/12	Complete							
4	P03 - Demonstração das iniciativas em andamento que interferem com o PROJETO de	21 days?	Mon 25/06/12	Mon 23/07/12	Complete							
5	P04 - Direcionadores táticos estabelecidos	21 days?	Mon 25/06/12	Mon 23/07/12	Complete							
6	FASE 02 – Validação do plano de trabalho, metodologia e cronograma	15 days?	Mon 25/06/12	Fri 13/07/12	Complete							
7	P05 - Plano de trabalho detalhando as atividades a serem executadas, as metodologias	15 days?	Mon 25/06/12	Fri 13/07/12	Complete							
8	P06 - Plano de Gerencia do PROJETO	15 days?	Mon 25/06/12	Fri 13/07/12	Complete							
9	FASE 03 – Desenvolvimento dos Planos de Projeto, aderentes a metodologia de gestão	77 days?	Mon 25/06/12	Tue 09/10/12	Complete							
10	P07.1 - Plano de Desenvolvimento de Escopo e Cronogramas consolidados.	36 days?	Tue 21/08/12	Tue 09/10/12	Complete							
11	P07.2 – Plano de Comunicação.	41 days?	Mon 25/06/12	Mon 20/08/12	Complete							
12	P07.3 - Plano de Recursos Humanos e Matriz de Responsabilidades definidos.	41 days?	Mon 25/06/12	Mon 20/08/12	Complete							
13	P07.4 - Plano de Controle de Mudanças definido.	41 days?	Mon 25/06/12	Mon 20/08/12	Complete							
14	P07.5 - Plano de Qualidade definido.	41 days?	Mon 25/06/12	Mon 20/08/12	Complete							
15	P07.6- Plano de Avaliação e Mapa de Riscos definido.	41 days?	Mon 25/06/12	Mon 20/08/12	Complete							
16	P07.7 - Plano de Integração e Gerenciamento do PROJETO Definido.	41 days?	Mon 25/06/12	Mon 20/08/12	Complete							
17	FASE 04 – Capacitação da equipe executiva em análise e redesenho dos processos de	92 days?	Mon 09/07/12	Tue 13/11/12	Complete							
18	P08 - CAPACITAÇÃO CONCLUÍDA, contemplando equipe executiva apta para atuar na:	78 days?	Mon 09/07/12	Tue 13/11/12	Complete							
19	FASE 05 – Mapeamento dos processos atuais	39 days?	Tue 26/06/12	Fri 17/08/12	Complete							
20	P09 - Relatório com fluxo dos processos atuais e identificação dos problemas e oportuni	39 days?	Tue 26/06/12	Fri 17/08/12	Complete							
21	FASE 06 – Redesenho da situação futura dos processos	188 days?	Wed 01/08/12	Fri 19/04/13	Late							
22	A10.1 - Prover apresentação das melhores práticas de processos de Gestão Financeira	28 days?	Wed 01/08/12	Fri 07/09/12	Complete							
23	A10.2 - Redesenhar os fluxos dos processos ate o nível de atividade, contendo: insumo	154 days?	Tue 11/09/12	Fri 12/04/13	Late							
24	A10.3 - Acompanhar e orientar os servidores públicos, indicados pela SEFAZ, nas oficir	154 days?	Tue 11/09/12	Fri 12/04/13	Late							
25	A10.4 - Definir os indicadores de desempenho vinculados aos processos redesenhados	30 days?	Mon 04/03/13	Fri 12/04/13	Future Task							
26	A11.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão.	32 days?	Thu 07/03/13	Fri 19/04/13	Future Task							
27	A11.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora – líder do processo em dis	32 days?	Thu 07/03/13	Fri 19/04/13	Future Task							
28	P10 - Documento com fluxos dos processos redesenhados e Indicadores de desempeñf	32 days?	Thu 07/03/13	Fri 19/04/13	Future Task							
29	P11 - Validação das proposições com a alta gestão.	32 days?	Thu 07/03/13	Fri 19/04/13	Future Task							
30	FASE 07 – Especificações de negócios para atendimento dos processos redesenhados	75 days?	Mon 07/01/13	Fri 19/04/13	Late							

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
Divisão 
Andamento 




Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 

Tarefas externas 
Etapa externa 
Data limite 

ID	Nome da tarefa	Duration	Start	Finish	Status	24 Jun '12						
						S	M	T	W	T	F	
31	A12 - Elaborar analise de divergências (gap) entre os processos atuais e os processos i	75 days?	Mon 07/01/13	Fri 19/04/13	Late							
32	A13.1 - Gerar as especificações ou requisitos de negócios e os requisitos funcionais de	75 days?	Mon 07/01/13	Fri 19/04/13	Late							
33	A13.2 - Validar com equipe executiva.	75 days?	Mon 07/01/13	Fri 19/04/13	Late							
34	A13.3 - Realizar apresentação para todo o corpo funcional da SAF.	32 days?	Thu 07/03/13	Fri 19/04/13	Future Task							
35	P12 - Documento com análises de (gaps) entre os processos atuais e os processos rede	32 days?	Thu 07/03/13	Fri 19/04/13	Future Task							
36	P13 - Documento com as especificações dos requisitos de negócio e de sistemas valida	32 days?	Thu 07/03/13	Fri 19/04/13	Future Task							
37	FASE 08 – Revisão da Arquitetura de Sistemas de Informação para os processos redes	80 days?	Mon 14/01/13	Fri 03/05/13	Future Task							
38	A14.1 - Realizar levantamento dos principais relacionamentos dos sistemas de informaç	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
39	A14.2 - Mapear a Situação Atual dos Relacionamentos dos Sistemas e componentes de	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
40	A14.3.1 - Realizar estratificação dos processos em linhas funcionais de acordo com a ir	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
41	A14.3.2 - Entender os volumes e tempos das linhas funcionais de maior importância	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
42	A14.3.3 - Entender os estrangulamentos:	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
43	- o Tempos inadequados;	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
44	- o Concentração de conhecimento;	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
45	- o Excesso de interfaces;	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
46	- o Atividades manuais.	75 days?	Mon 14/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
47	A14.3.4 - Definir o Modelo de Avaliação de Aderência de Soluções de TI.	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
48	A14.3.5 - Validar com equipe executiva e DTI.	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
49	A15.1 - Identificar alternativas de referencia de soluções de mercado para Arquitetura di	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
50	A15.2 - Analisar a Aderência de Requisitos versus soluções de sistemas atuais ou nova	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
51	A15.3 - Efetuar analises comparativas (utilizando inclusive gráficos demonstrativos) par	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
52	A15.4 - Definir a Visão Futura de Referencia da Arquitetura de Sistemas	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
53	A15.5 - Realizar seminários de feedback com equipe de DTI	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
54	A15.6 - Apresentar recomendações quanto a Arquitetura de Sistemas	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
55	A15.7 - Validar com equipe executiva e DTI.	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
56	A16.1 - Organizar os requisitos por componentes de sistemas a serem adquiridos / licita	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
57	A16.2 - Definir modelos finais de avaliação para aquisições de sistemas	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
58	A16.3 - Validar com equipe executiva e DTI.	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
59	A16.4 - Realizar seminário com equipe técnica da DTI.	65 days?	Mon 28/01/13	Fri 26/04/13	Future Task							
60	P14 - Mapeamento dos impactos dos novos processos redesenhados na arquitetura de :	5 days?	Mon 29/04/13	Fri 03/05/13	Future Task							

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
Divisão 
Andamento 



Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 



Tarefas externas 
Etapa externa 
Data limite 

ID	Nome da tarefa	Duration	Start	Finish	Status	24 Jun '12						
						S	M	T	W	T	F	
61	P14.1 - Estrato de linhas funcionais dos macro processos classificadas por importância	5 days?	Mon 29/04/13	Fri 03/05/13	Future Task							
62	P14.2 - Identificação e diagnóstico dos principais pontos de estrangulamento existentes	5 days?	Mon 29/04/13	Fri 03/05/13	Future Task							
63	P14.3 - Relatório da análise de aderência dos sistemas legados (atuais).	5 days?	Mon 29/04/13	Fri 03/05/13	Future Task							
64	P15 - Relatório descritivo da arquitetura de sistemas recomendada.	5 days?	Mon 29/04/13	Fri 03/05/13	Future Task							
65	P16 – Especificação dos requisitos funcionais e não funcionais por sistema da arquitetura	5 days?	Mon 29/04/13	Fri 03/05/13	Future Task							
66	FASE 09 – Revisão das soluções de middleware da arquitetura tecnológica, necessária	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
67	A17 - Identificar e analisar os pontos de estrangulamentos da arquitetura tecnológica	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
68	A17.1 - A partir dos produtos do redesenho de processos, analisar alternativas e meios	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
69	A17.2 - Realizar levantamento das soluções de middleware de referência de mercado a	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
70	A17.3 - Para soluções críticas (lista curta) da arquitetura tecnológica necessária, análise	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
71	A17.4 - Analisar custos referenciais de mercado e análise geral de custo x benefício par	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
72	A17.5 - Confirmar parâmetros para soluções da lista curta e definir informações para Pr	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
73	A18 - Analisar aspectos de segurança, incorporando as melhores práticas de acesso, s;	45 days?	Mon 28/01/13	Fri 29/03/13	Future Task							
74	P17 – Recomendações para arquiteturas tecnológicas da Sefaz..	5 days?	Mon 25/03/13	Fri 29/03/13	Future Task							
75	P17.1 Mapa dos principais pontos de estrangulamento existentes na arquitetura atual de	5 days?	Mon 25/03/13	Fri 29/03/13	Future Task							
76	P17.2 – Definição de novos componentes das arquiteturas tecnológicas para a SAF	5 days?	Mon 25/03/13	Fri 29/03/13	Future Task							
77	P17.3 – Definição de premissas não funcionais para soluções da arquitetura tecnológica	5 days?	Mon 25/03/13	Fri 29/03/13	Future Task							
78	P17.4 – Lista curta com soluções de referência que apresentem relações de custo X ber	5 days?	Mon 25/03/13	Fri 29/03/13	Future Task							
79	P17.5 – Parâmetros gerais referenciais para componentes de middleware da arquitetura	5 days?	Mon 25/03/13	Fri 29/03/13	Future Task							
80	P18 – Definição dos critérios de segurança das informações, garantindo salvaguarda da	5 days?	Mon 25/03/13	Fri 29/03/13	Future Task							
81	FASE 10 – Realinhamento da Estrutura Organizacional da SAF	60 days?	Mon 04/03/13	Fri 24/05/13	Future Task							
82	A19 - Redesenhar a estrutura organizacional e física da SAF com base nos processos r	60 days?	Mon 04/03/13	Fri 24/05/13	Future Task							
83	A19.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão.	60 days?	Mon 04/03/13	Fri 24/05/13	Future Task							
84	A19.2 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora – líder do processo em dis	60 days?	Mon 04/03/13	Fri 24/05/13	Future Task							
85	A19.3 - Realizar apresentação para todo o corpo funcional da SAF.	60 days?	Mon 04/03/13	Fri 24/05/13	Future Task							
86	P19 – Nova estrutura definida e validada pela SEFAZ, para as diretorias financeiras da a	60 days?	Mon 04/03/13	Fri 24/05/13	Future Task							
87	FASE 11 – Proposição de competências e perfis profissionais	40 days?	Tue 02/04/13	Mon 27/05/13	Future Task							
88	A20 - Propor competências e perfis profissionais dos gestores de processos e postos de	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
89	A21.1 - Propor perfil dos postos de trabalho, contemplando funções, atividades e crític	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
90	A21.2 - Sugerir os pressupostos para a criação de um cargo para a área de administraç	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
Divisão 
Andamento 

Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 




Tarefas externas 
Etapa externa 
Data limite 


ID	Nome da tarefa	Duration	Start	Finish	Status	24 Jun '12						
						S	M	T	W	T	F	
91	A22.1 - Apresentar a especificação das divergências (gás) gerais de capacitação de ges	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
92	A22.2 - Validar com equipe executiva e alta gestão.	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
93	A22.3 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora – líder do processo em dis	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
94	A22.4 - Realizar apresentação para todo o corpo funcional da SAF.	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
95	P20 – Competências e perfis profissionais dos gestores de processos e postos de trabal	40 days?	Tue 02/04/13	Mon 27/05/13	Future Task							
96	P21 – Critérios propostos e validados pela SEFAZ, para preenchimento dos cargos de g	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
97	P22 – Documento contendo o plano de competências e capacitações da SAF.	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
98	FASE 12 – Desenvolvimento do plano de implantação	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
99	A23.1 - Elaborar plano de implantação dos novos processos, estrutura e postos de trab:	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
100	A23.2 - Validar com equipe executiva e alta gestão.	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
101	A23.3 - Realizar seminários de feedback com equipe gestora – líder do processo em dis	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
102	P23 – Plano de Implantação validado pela SEFAZ contemplando: ações, prazos e respo	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
103	FASE 13 – Plano de implantação para oportunidades de ganhos imediatos	65 days?	Tue 02/04/13	Mon 01/07/13	Future Task							
104	A24.1 - Segmentar os novos processos em conjuntos de ações e iniciativas que possam	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
105	A24.2 - Associar a cada conjunto de ações e iniciativas aspectos de investimento, consi	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
106	A24.3 - Identificar oportunidades de atuação imediata que tragam benefícios rápidos e ç	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
107	A24.4 - Estabelecer um plano de ação para estas oportunidades	30 days?	Tue 02/04/13	Mon 13/05/13	Future Task							
108	P24 - Plano de ação para implementar oportunidades melhorias em curto prazo.	35 days?	Tue 14/05/13	Mon 01/07/13	Future Task							
109	FASE 14 – Apresentação do Relatório Final	16 days?	Mon 20/05/13	Mon 10/06/13	Future Task							
110	A25 - Elaborar o relatório final contendo a consolidação dos produtos previstos e revisa	16 days?	Mon 20/05/13	Mon 10/06/13	Future Task							
111	A25.1 - Validar com equipe executiva e alta gestão.	16 days?	Mon 20/05/13	Mon 10/06/13	Future Task							
112	P25 – Consolidação dos relatórios parciais de cada etapa formalizando a conclusão dos	16 days?	Mon 20/05/13	Mon 10/06/13	Future Task							
113	FASE 15 – Apoio ao gerenciamento das implantações	166 days?	Tue 14/05/13	Tue 31/12/13	Future Task							
114	A26.1 - Apoiar a Direção, Coordenação do Projeto e Equipe Técnica na gestão da mud:	166 days?	Tue 14/05/13	Tue 31/12/13	Future Task							
115	A26.2 - Apoiar a garantia da aderência dos processos em implementação pelas novas s	166 days?	Tue 14/05/13	Tue 31/12/13	Future Task							
116	A26.3 - Apoiar a análise de riscos e recomendações para preparação das Pessoas para	166 days?	Tue 14/05/13	Tue 31/12/13	Future Task							
117	A26.4 - Apoiar o desenvolvimento de ações de implantação.	166 days?	Tue 14/05/13	Tue 31/12/13	Future Task							
118	A26.5 - Status Report. mensal referente à gestão do projeto	166 days?	Tue 14/05/13	Tue 31/12/13	Future Task							
119	P26 – Apoio ao gerenciamento das implantações.	166 days?	Tue 14/05/13	Tue 31/12/13	Future Task							

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
Divisão 
Andamento 

Etapa 
Resumo 
Resumo do projeto 

Tarefas externas 
Etapa externa 
Data limite 

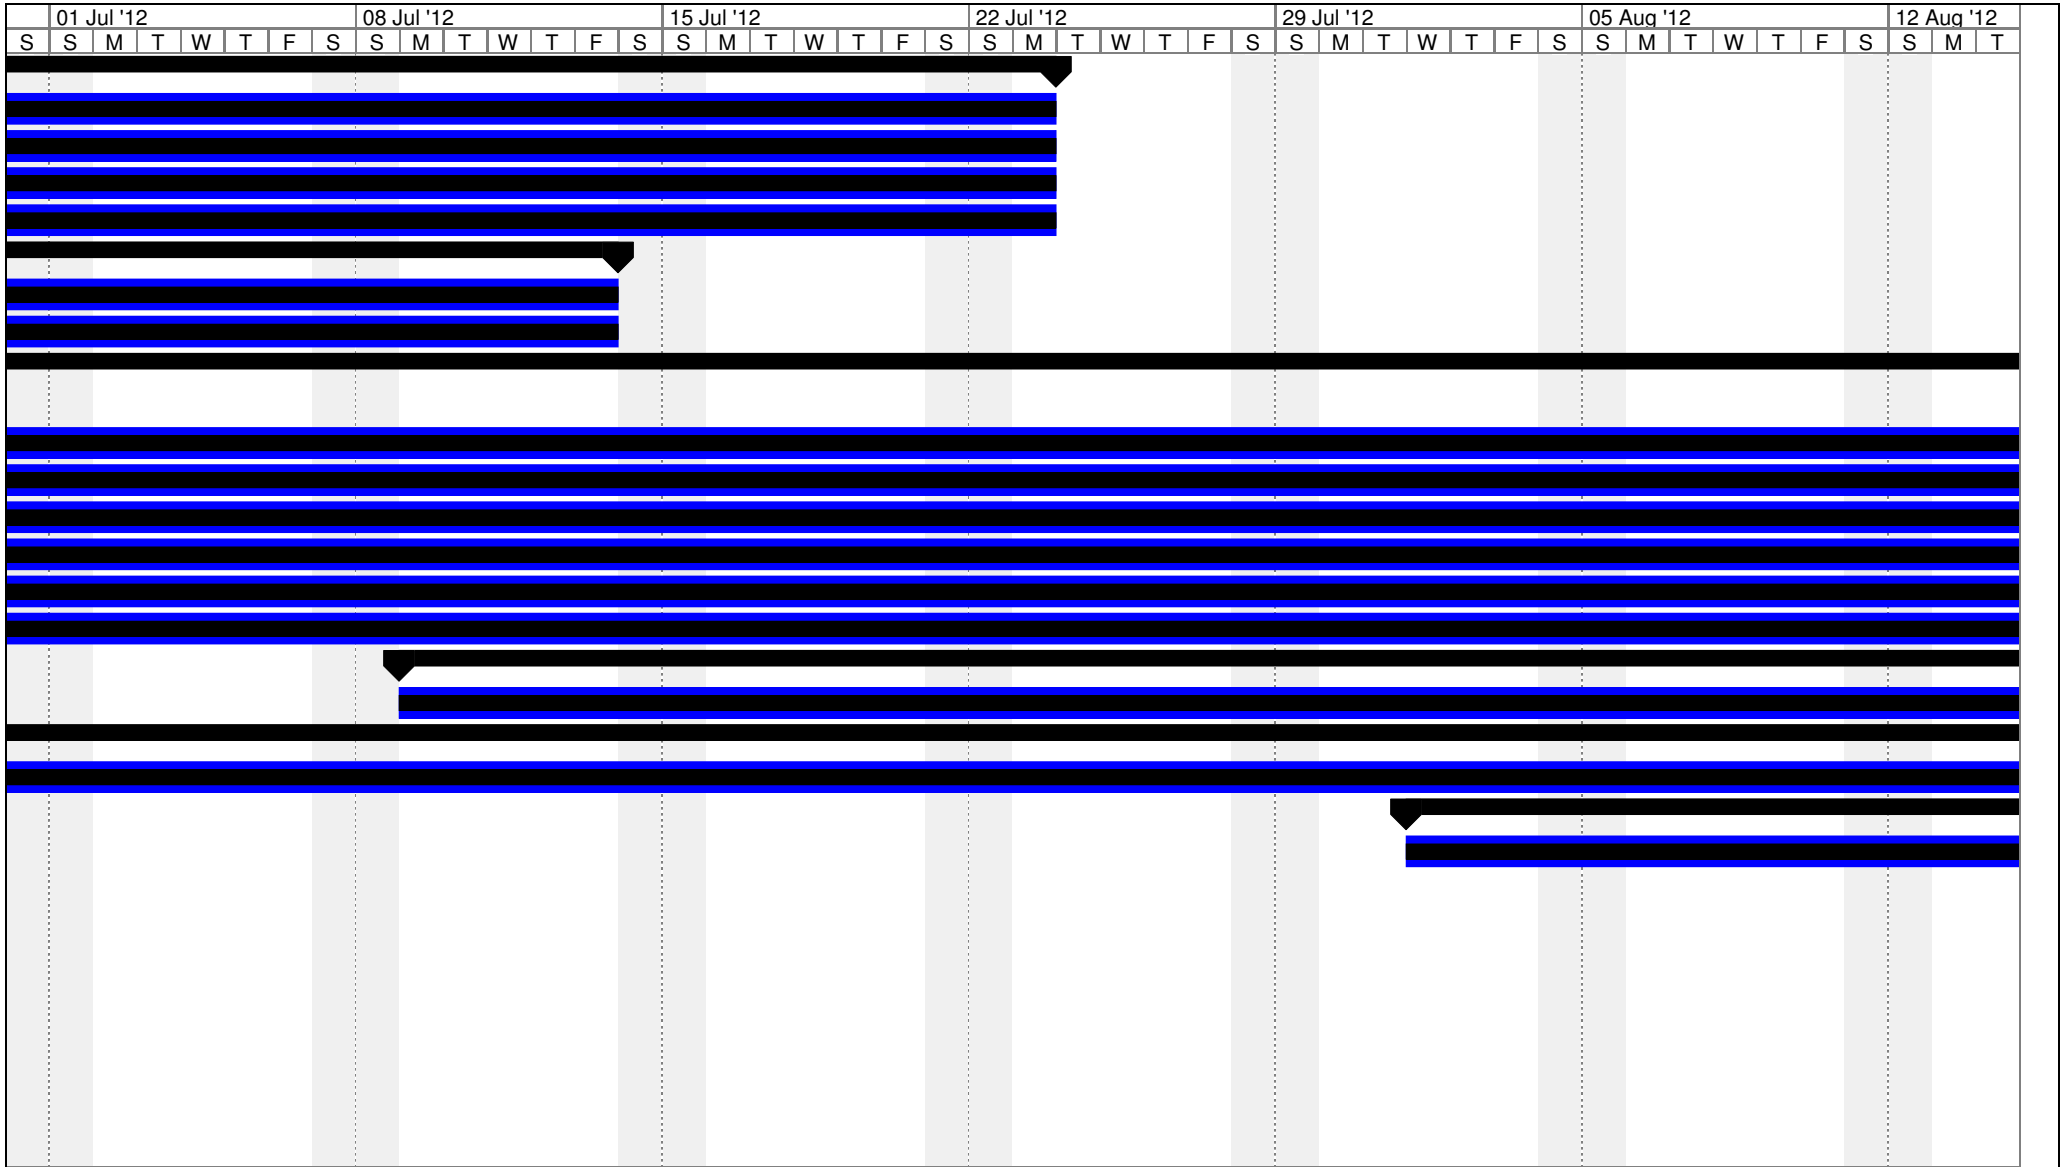










Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
 Divisão 
 Andamento 










Etapa 
 Resumo 
 Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Data limite 

01 Jul '12							08 Jul '12							15 Jul '12							22 Jul '12							29 Jul '12							05 Aug '12							12 Aug '12			
S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

01 Jul '12							08 Jul '12							15 Jul '12							22 Jul '12							29 Jul '12							05 Aug '12							12 Aug '12			
S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

01 Jul '12							08 Jul '12							15 Jul '12							22 Jul '12							29 Jul '12							05 Aug '12							12 Aug '12			
S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 

Divisão 

Andamento 

Etapa 

Resumo 

Resumo do projeto 

Tarefas externas 

Etapa externa 

Data limite 

19 Aug '12				26 Aug '12				02 Sep '12				09 Sep '12				16 Sep '12				23 Sep '12																		
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
 Divisão 
 Andamento 

Etapa 
 Resumo 
 Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Data limite 

19 Aug '12				26 Aug '12				02 Sep '12				09 Sep '12				16 Sep '12				23 Sep '12																		
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 

Divisão 


Andamento 

Etapa 

Resumo 

Resumo do projeto 

Tarefas externas 

Etapa externa 

Data limite 

19 Aug '12				26 Aug '12				02 Sep '12				09 Sep '12				16 Sep '12				23 Sep '12																		
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 

Divisão 


Andamento 

Etapa 


Resumo 

Resumo do projeto 







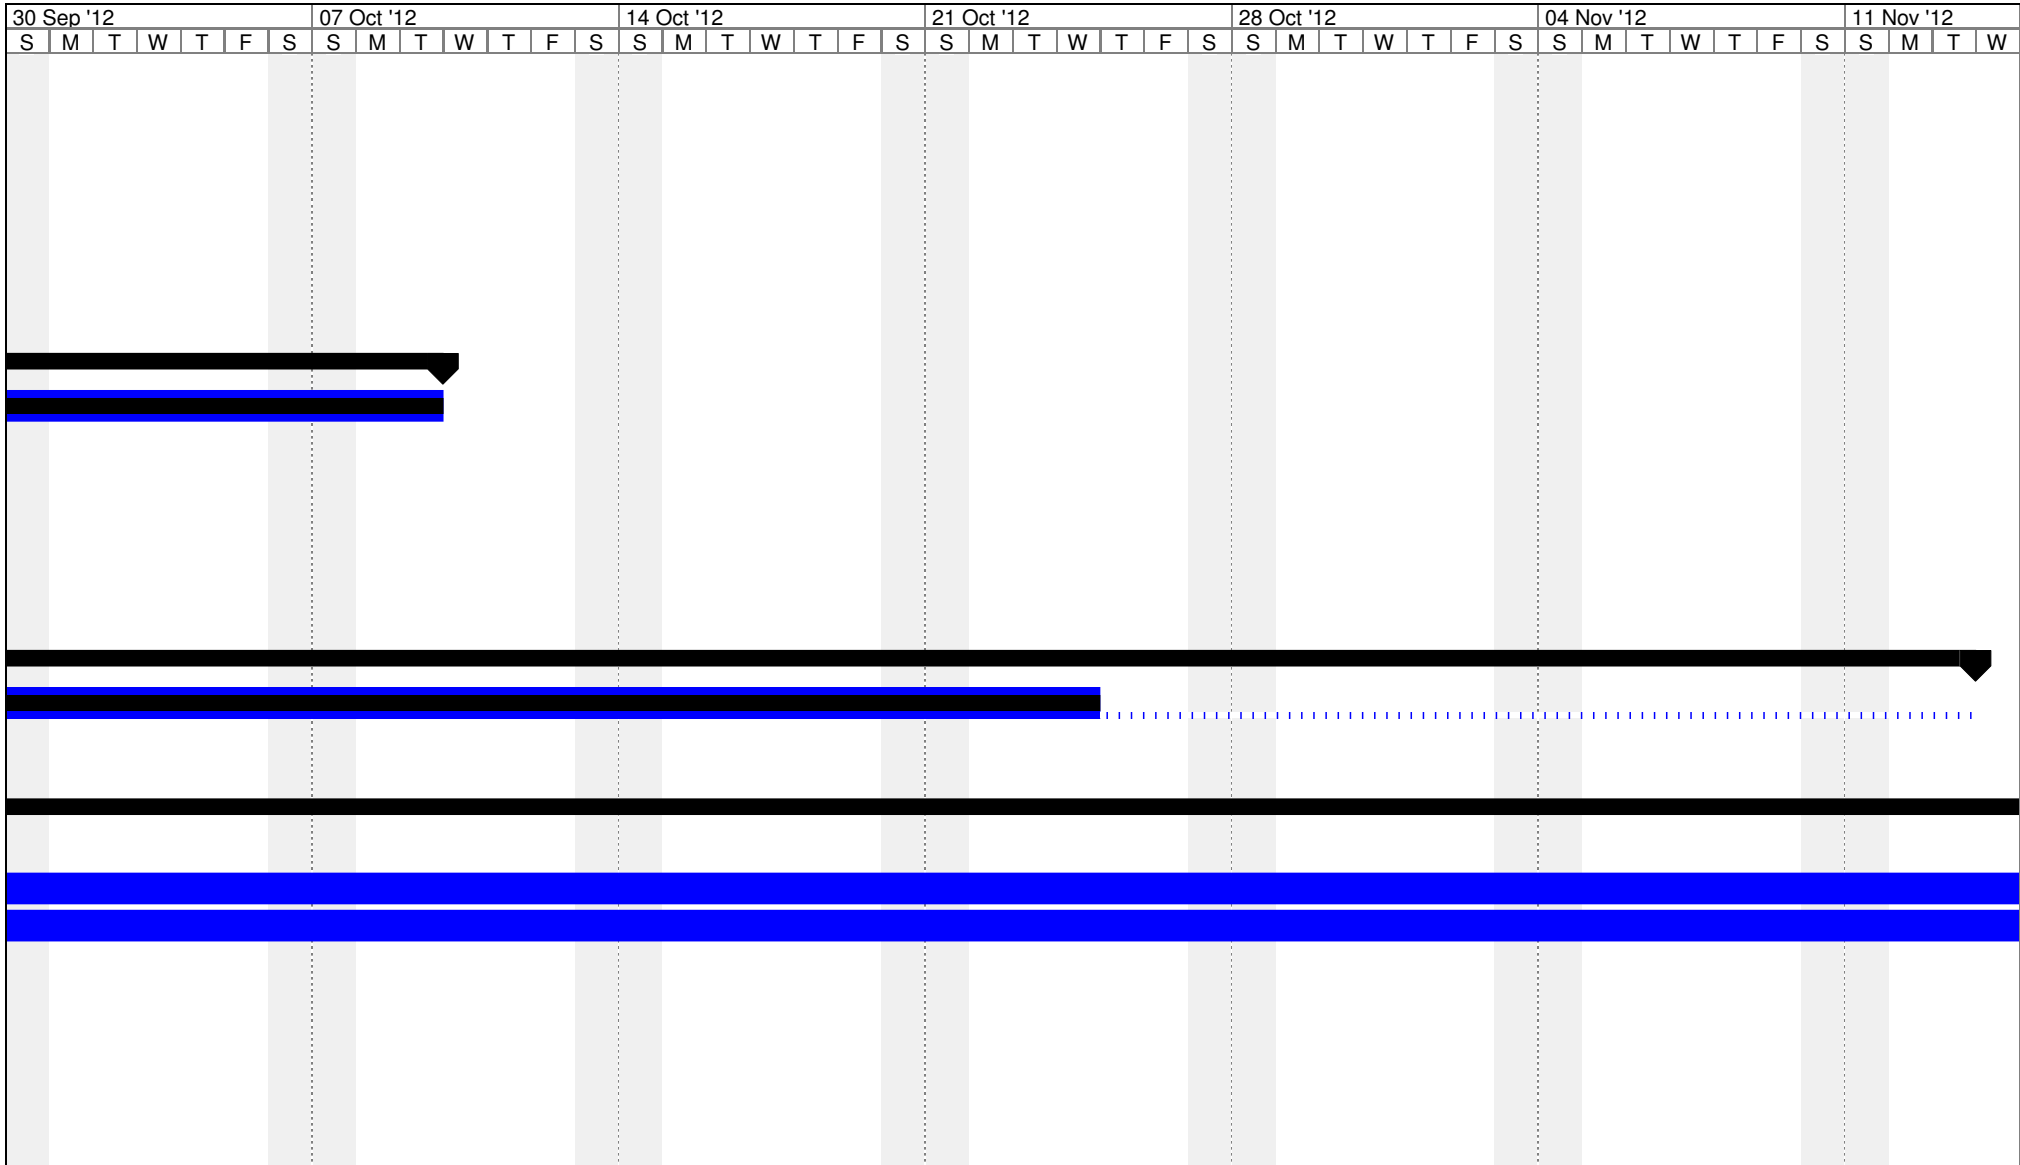


Tarefas externas 

Etapa externa 










Data limite 












Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	










30 Sep '12							07 Oct '12							14 Oct '12							21 Oct '12							28 Oct '12							04 Nov '12							11 Nov '12			
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	







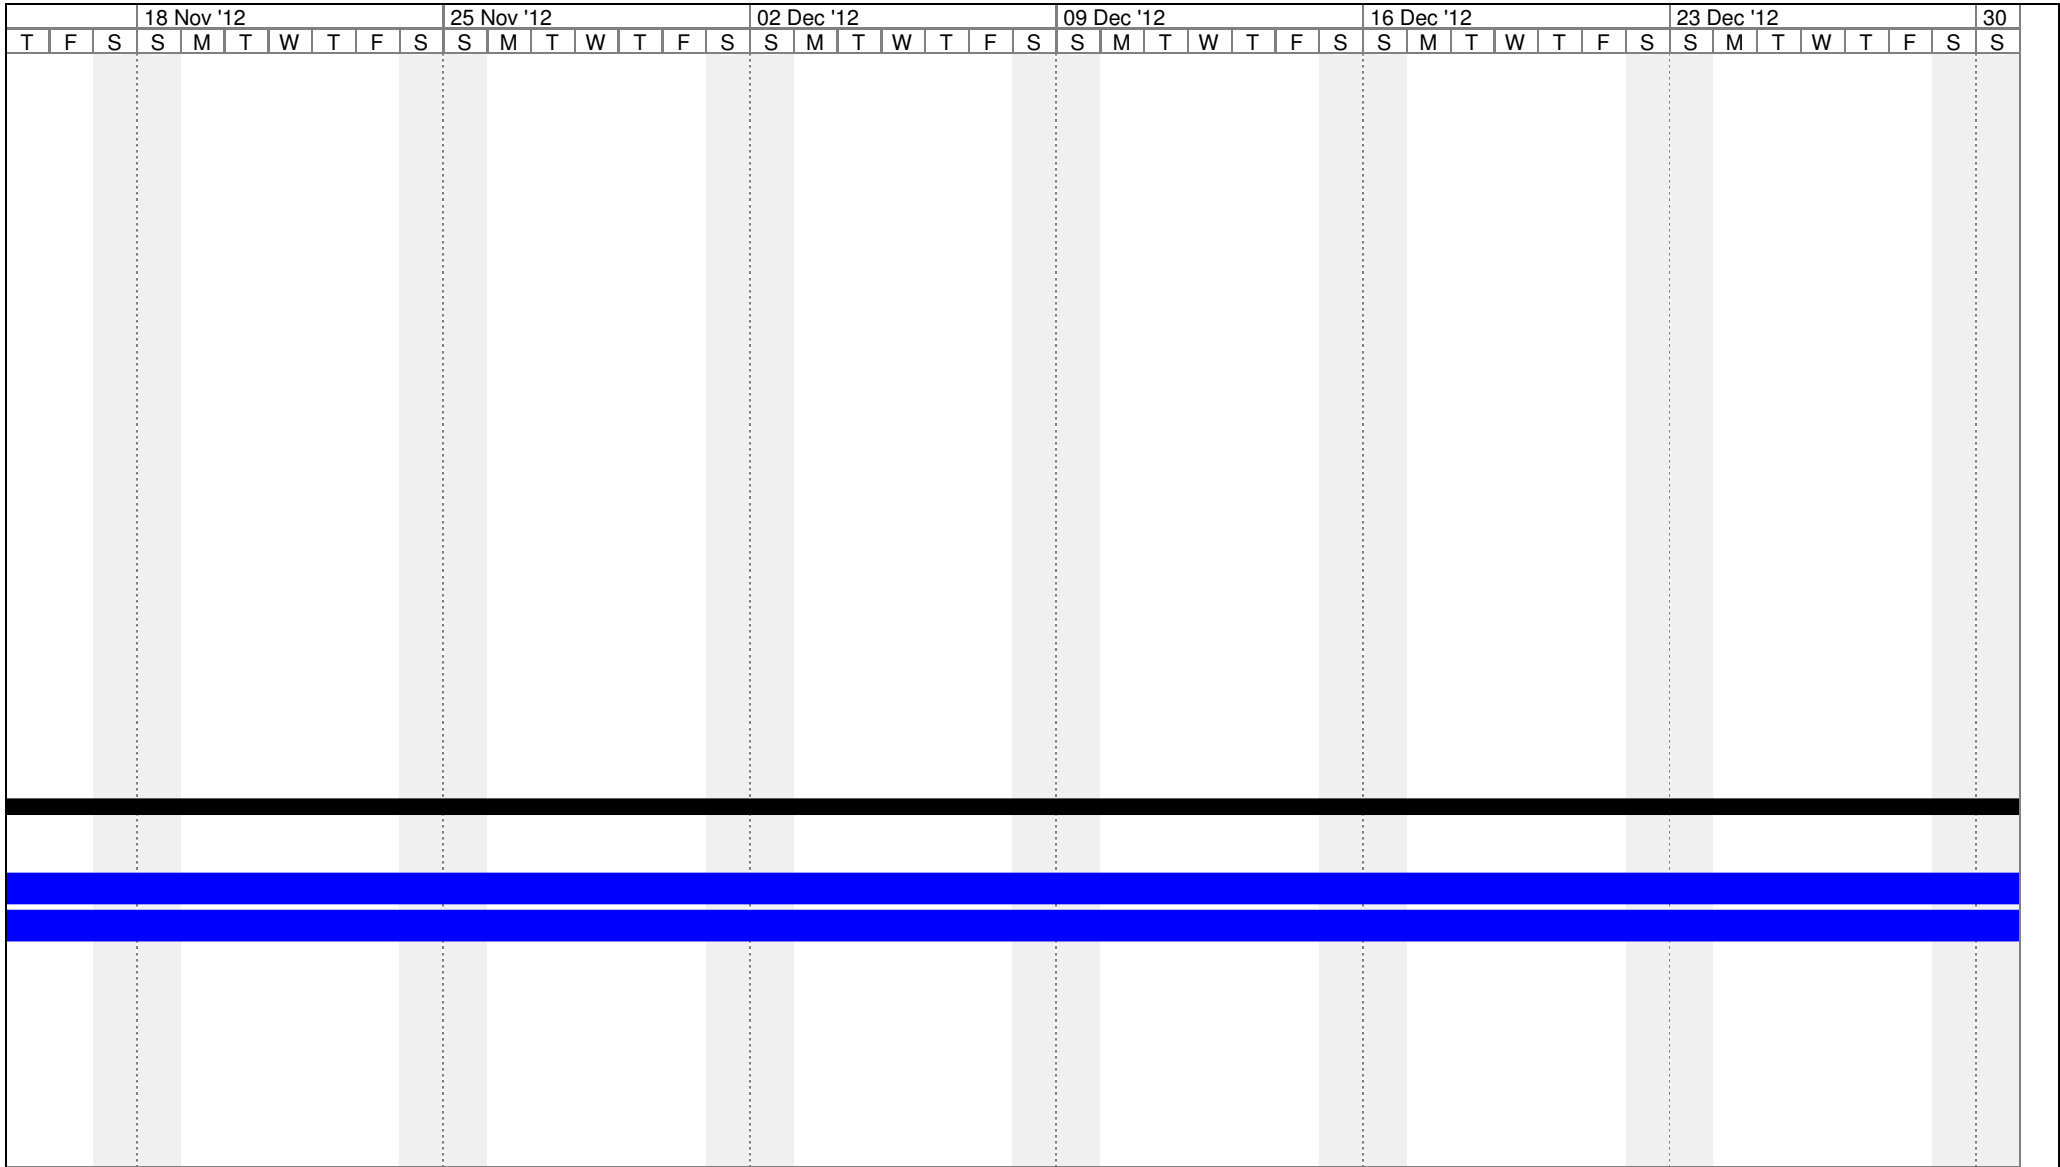


30 Sep '12							07 Oct '12							14 Oct '12							21 Oct '12							28 Oct '12							04 Nov '12							11 Nov '12			
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	










30 Sep '12							07 Oct '12							14 Oct '12							21 Oct '12							28 Oct '12							04 Nov '12							11 Nov '12			
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	












Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	










18 Nov '12			25 Nov '12					02 Dec '12					09 Dec '12					16 Dec '12					23 Dec '12					30										
T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	


18 Nov '12			25 Nov '12					02 Dec '12					09 Dec '12					16 Dec '12					23 Dec '12					30										
T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

18 Nov '12			25 Nov '12					02 Dec '12					09 Dec '12					16 Dec '12					23 Dec '12					30										
T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S



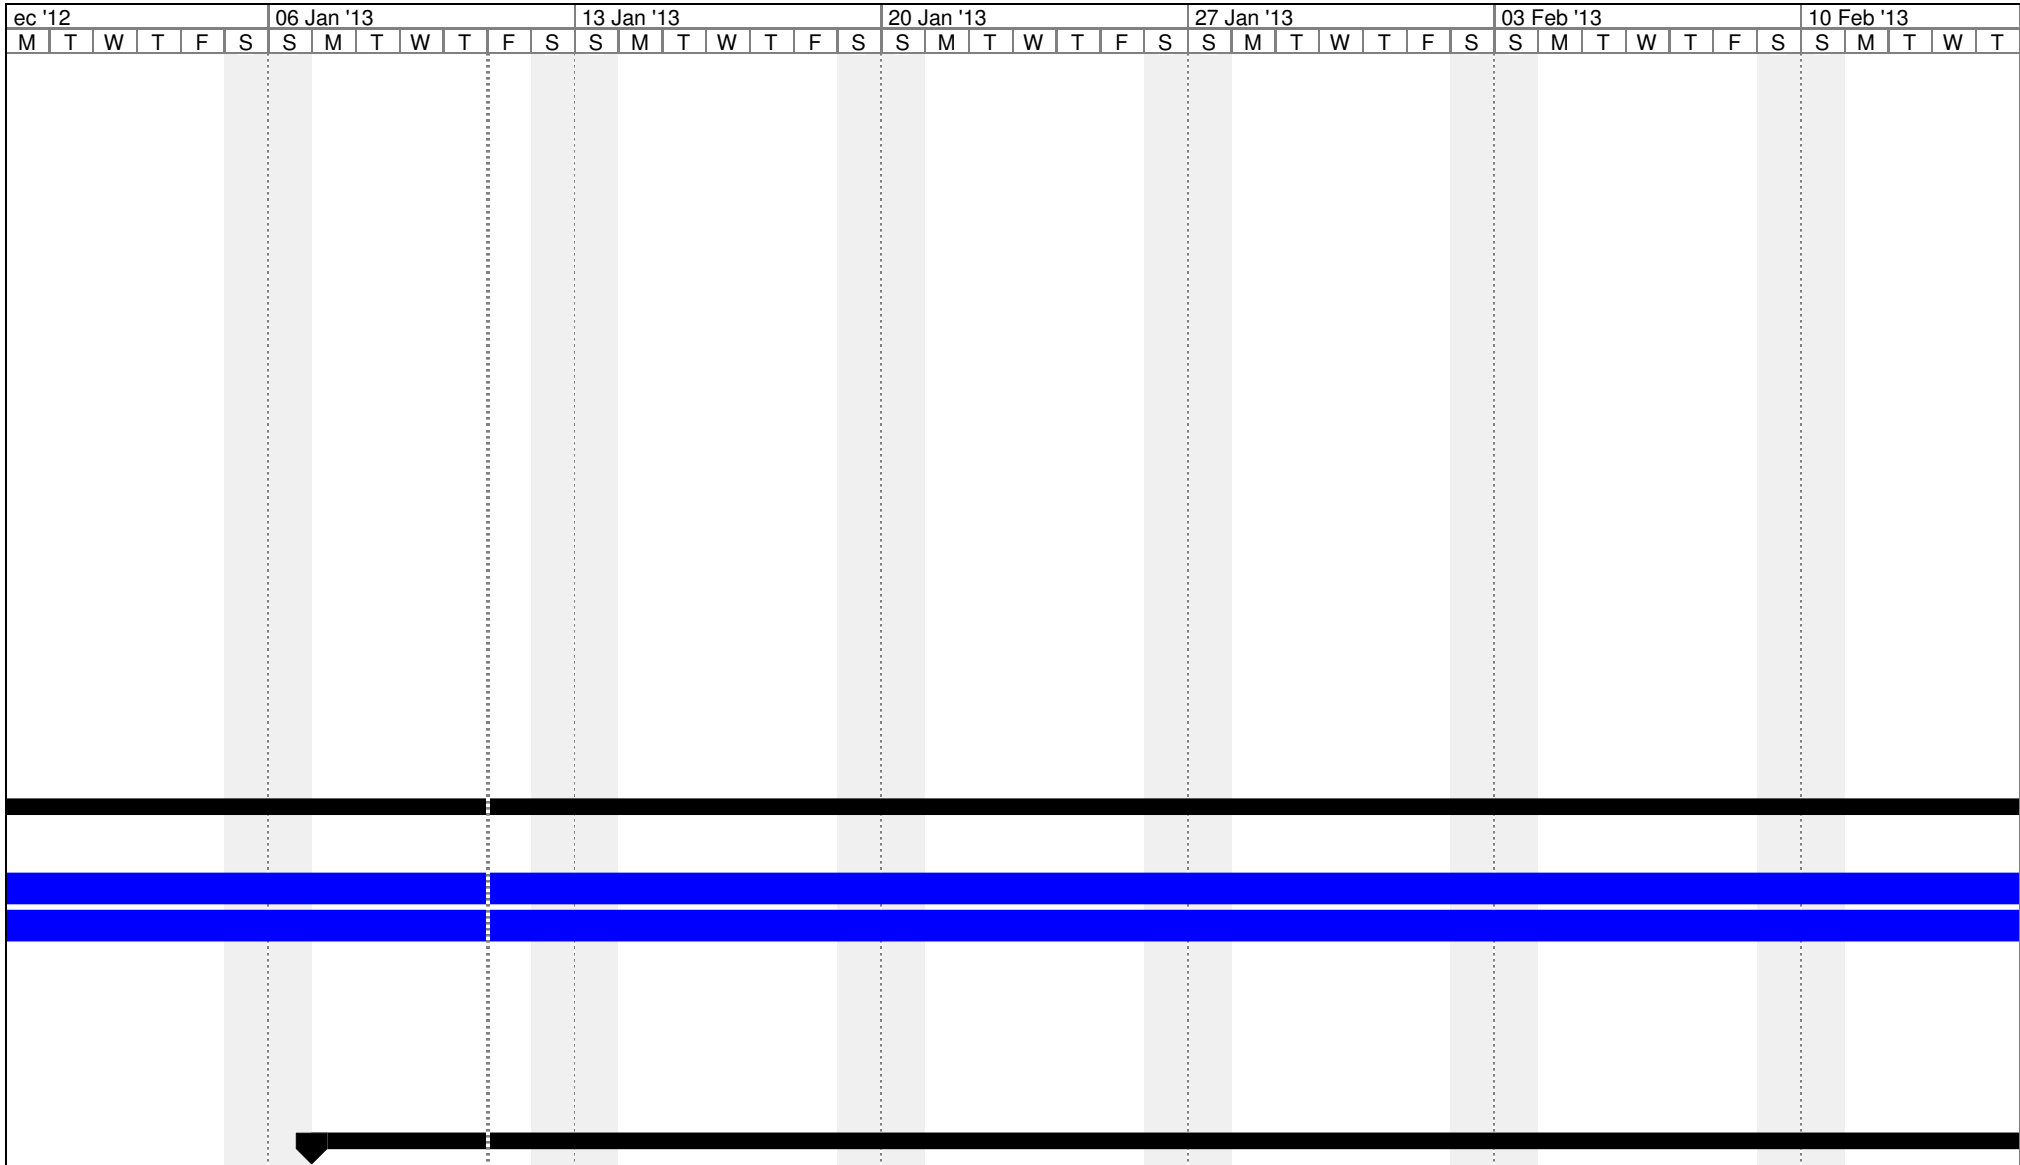



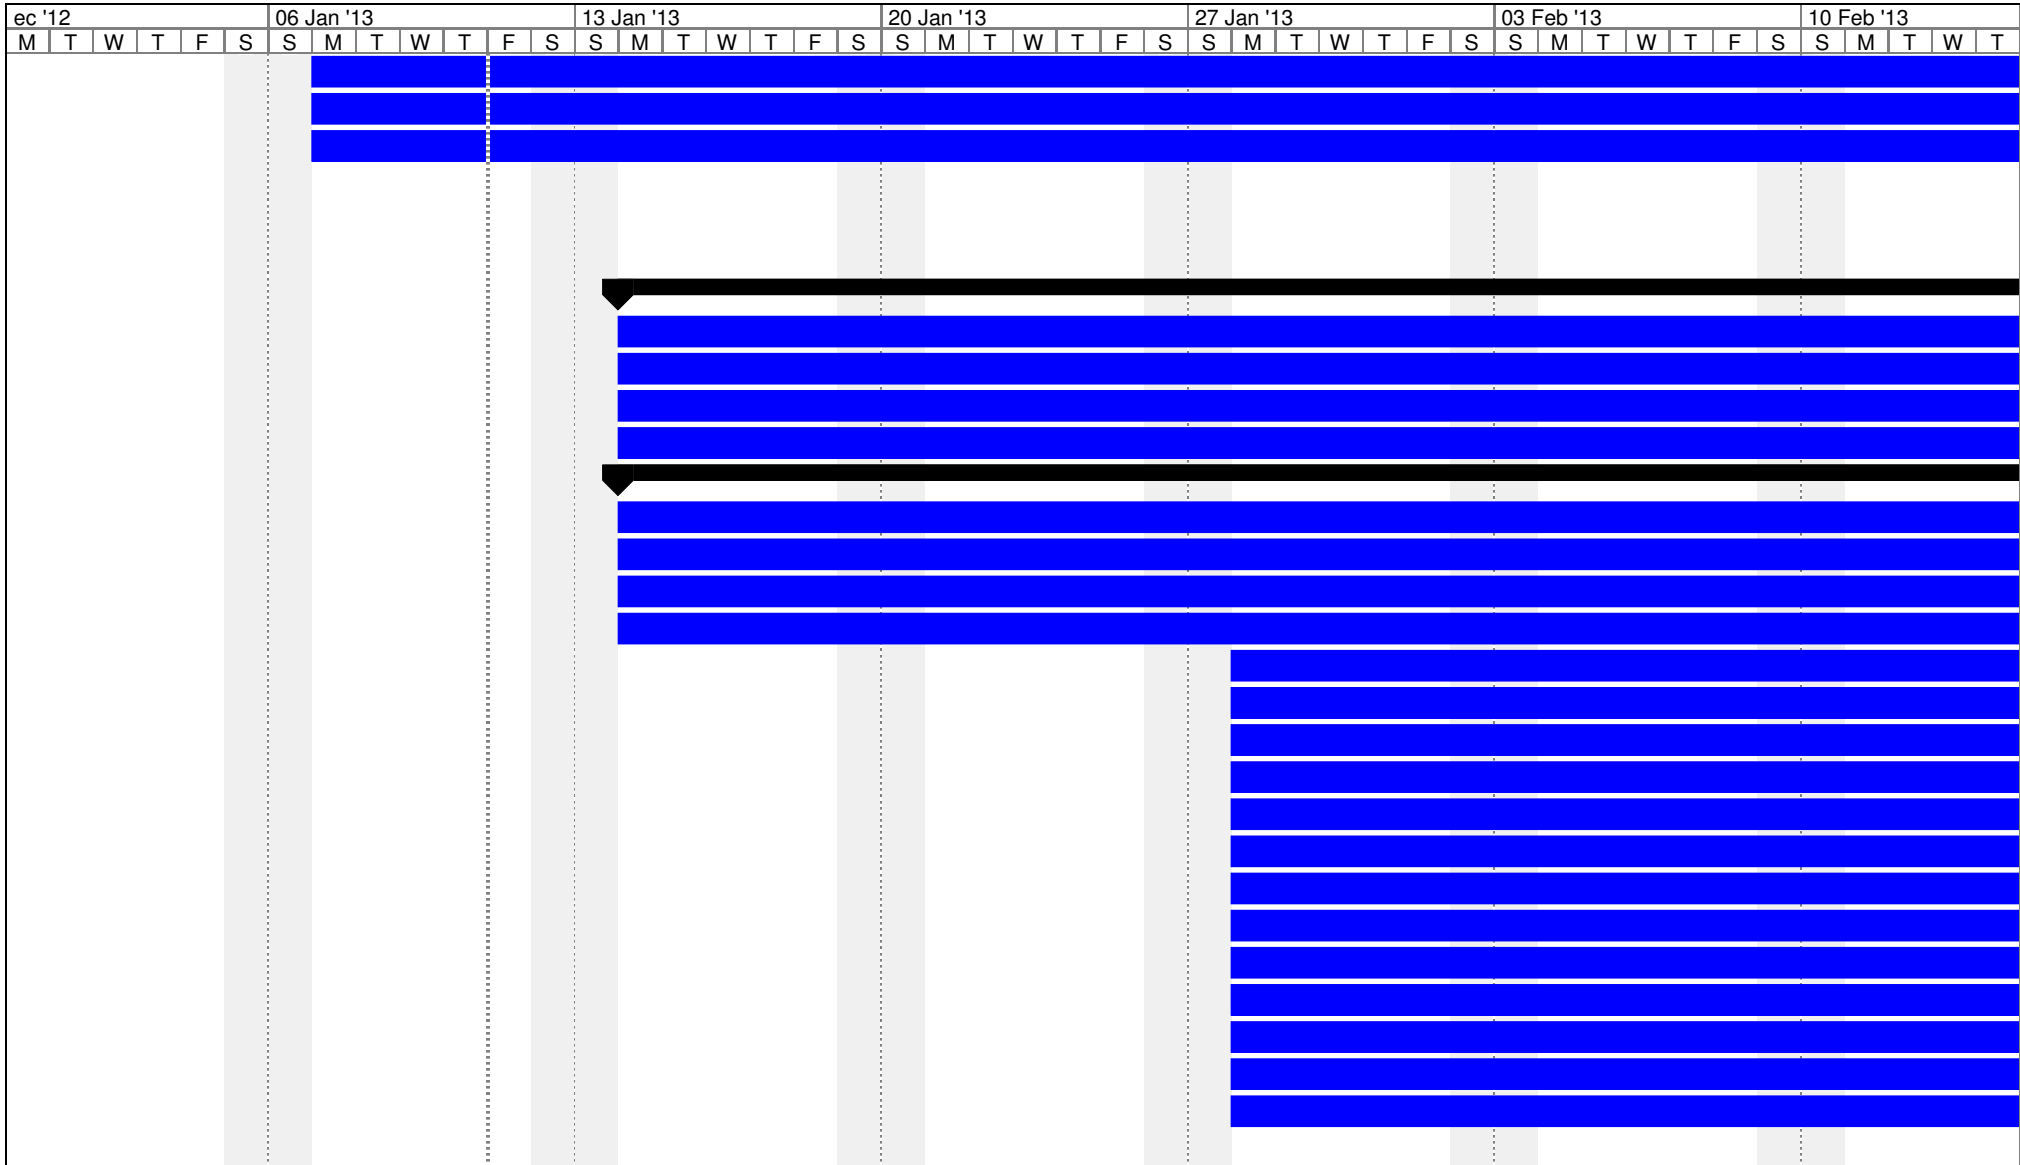

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	




Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	







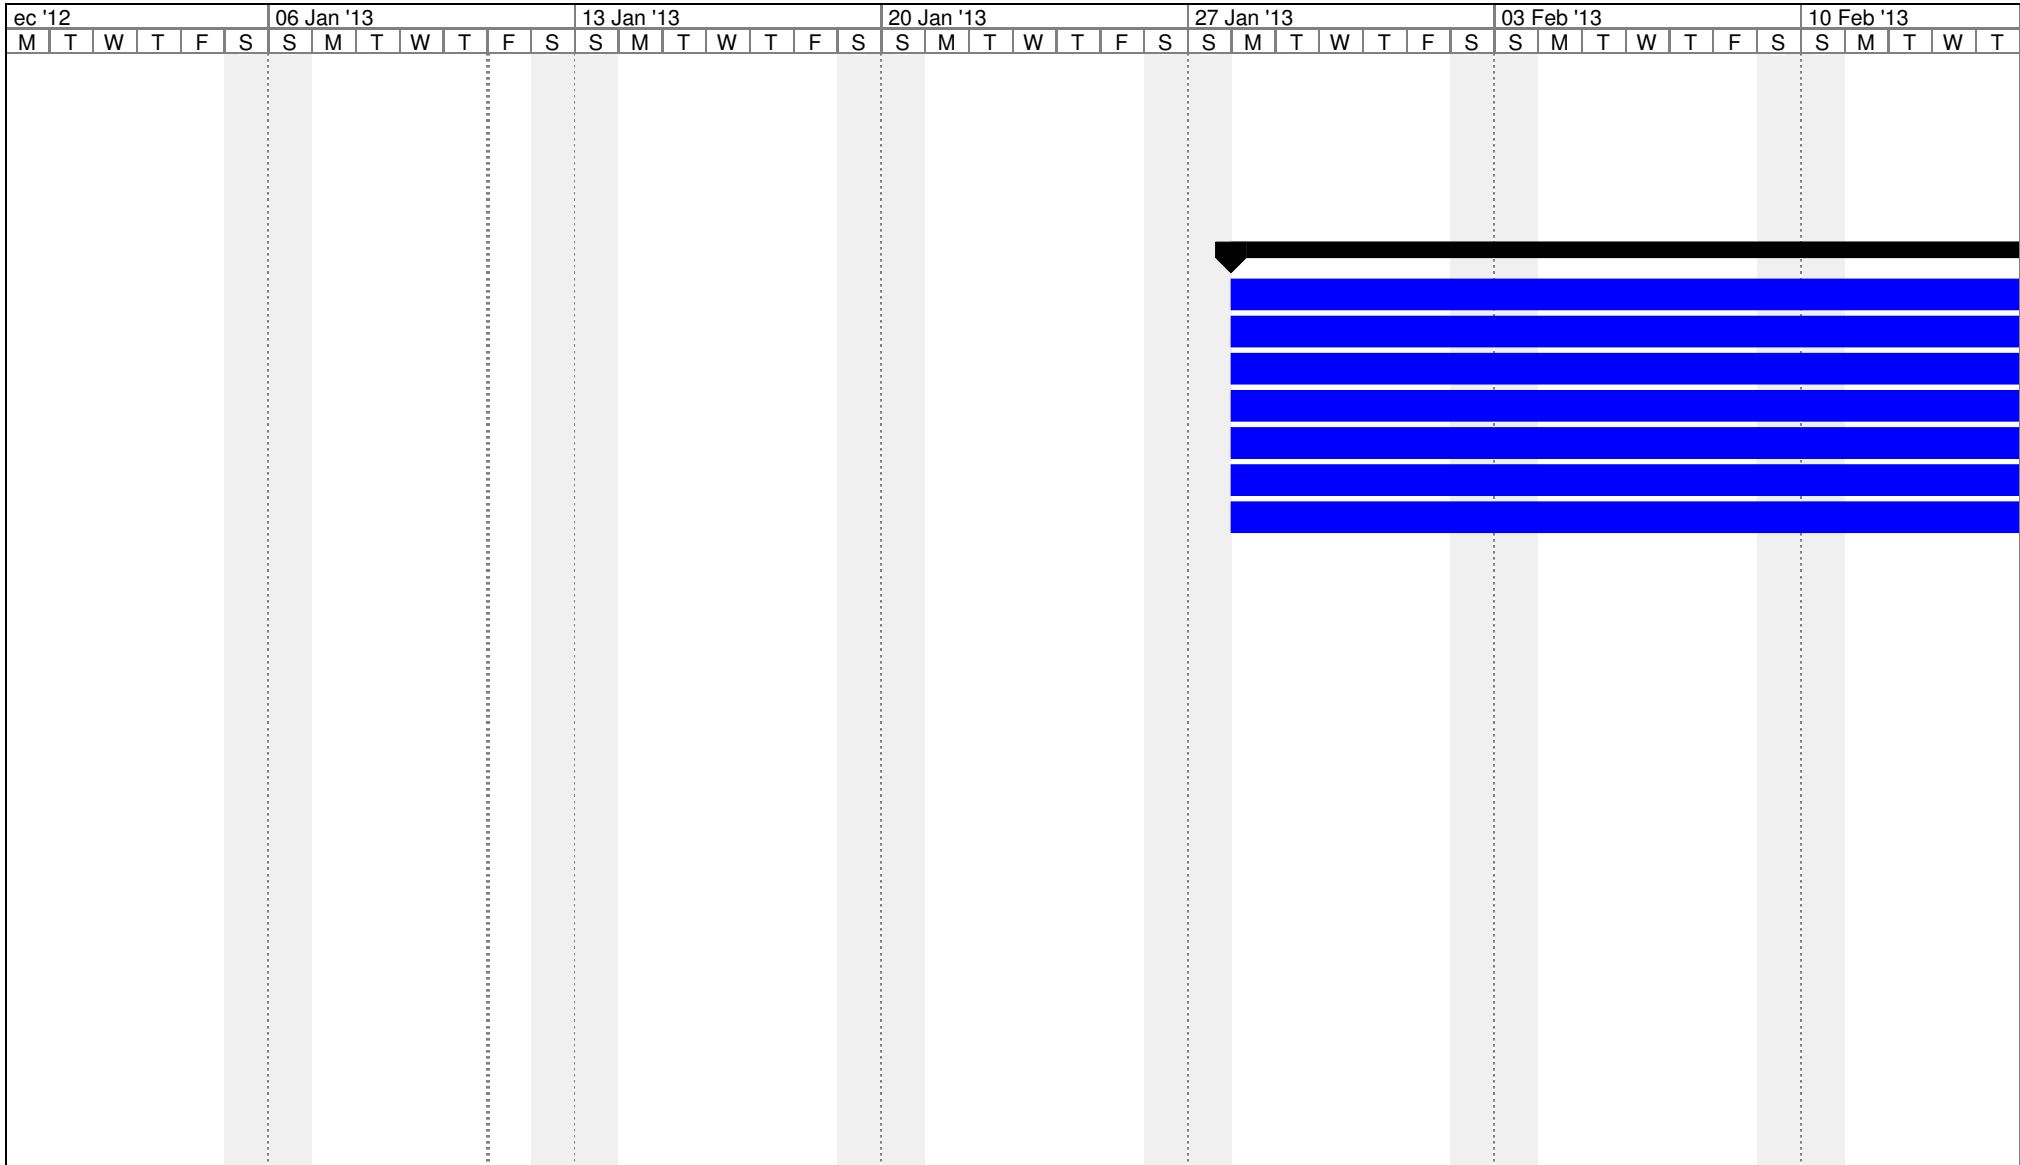




Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13


Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	



Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

ec '12							06 Jan '13							13 Jan '13							20 Jan '13							27 Jan '13							03 Feb '13							10 Feb '13						
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T			

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

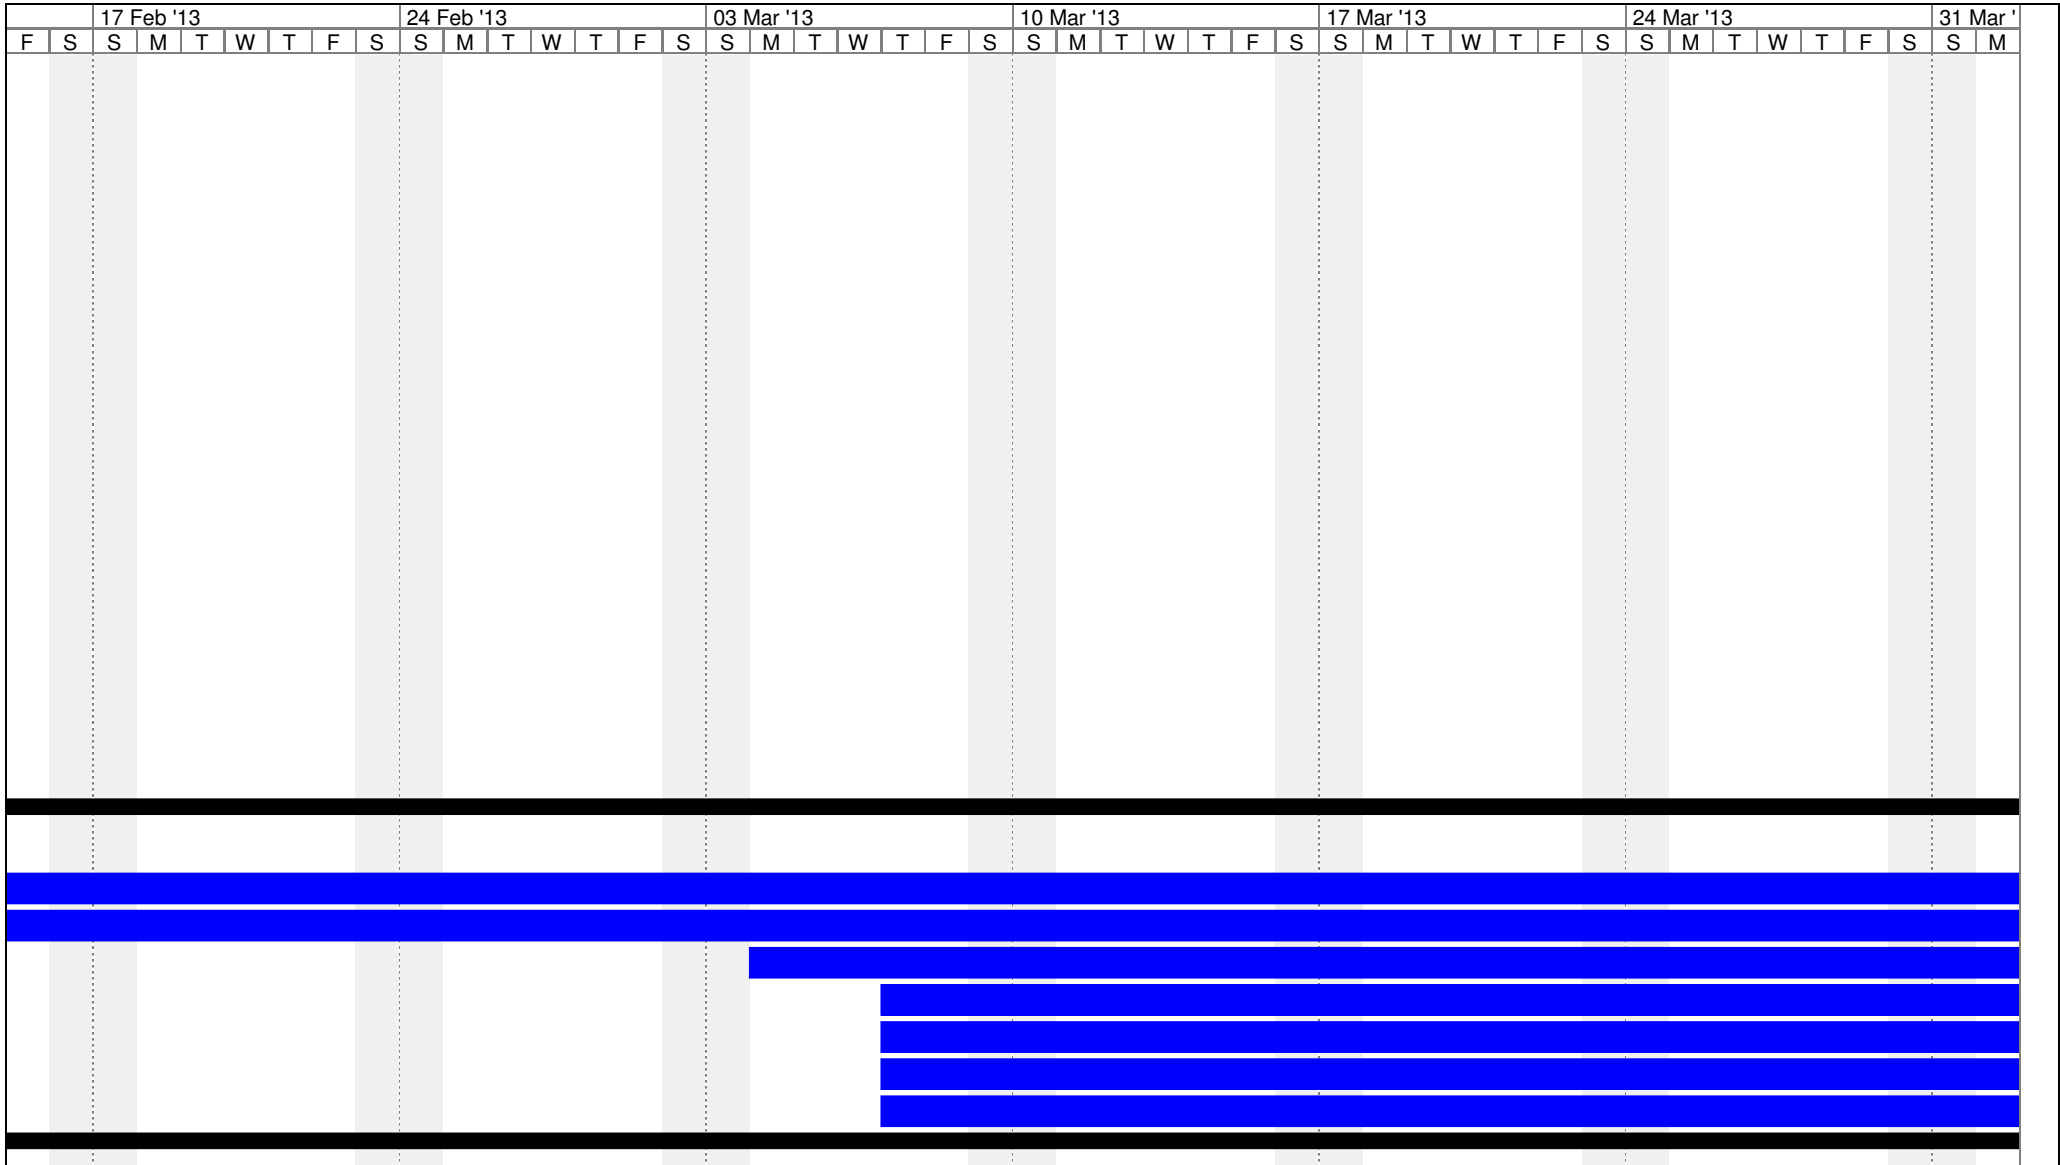


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
 Divisão 
 Andamento 

Etapa 
 Resumo 
 Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Data limite 

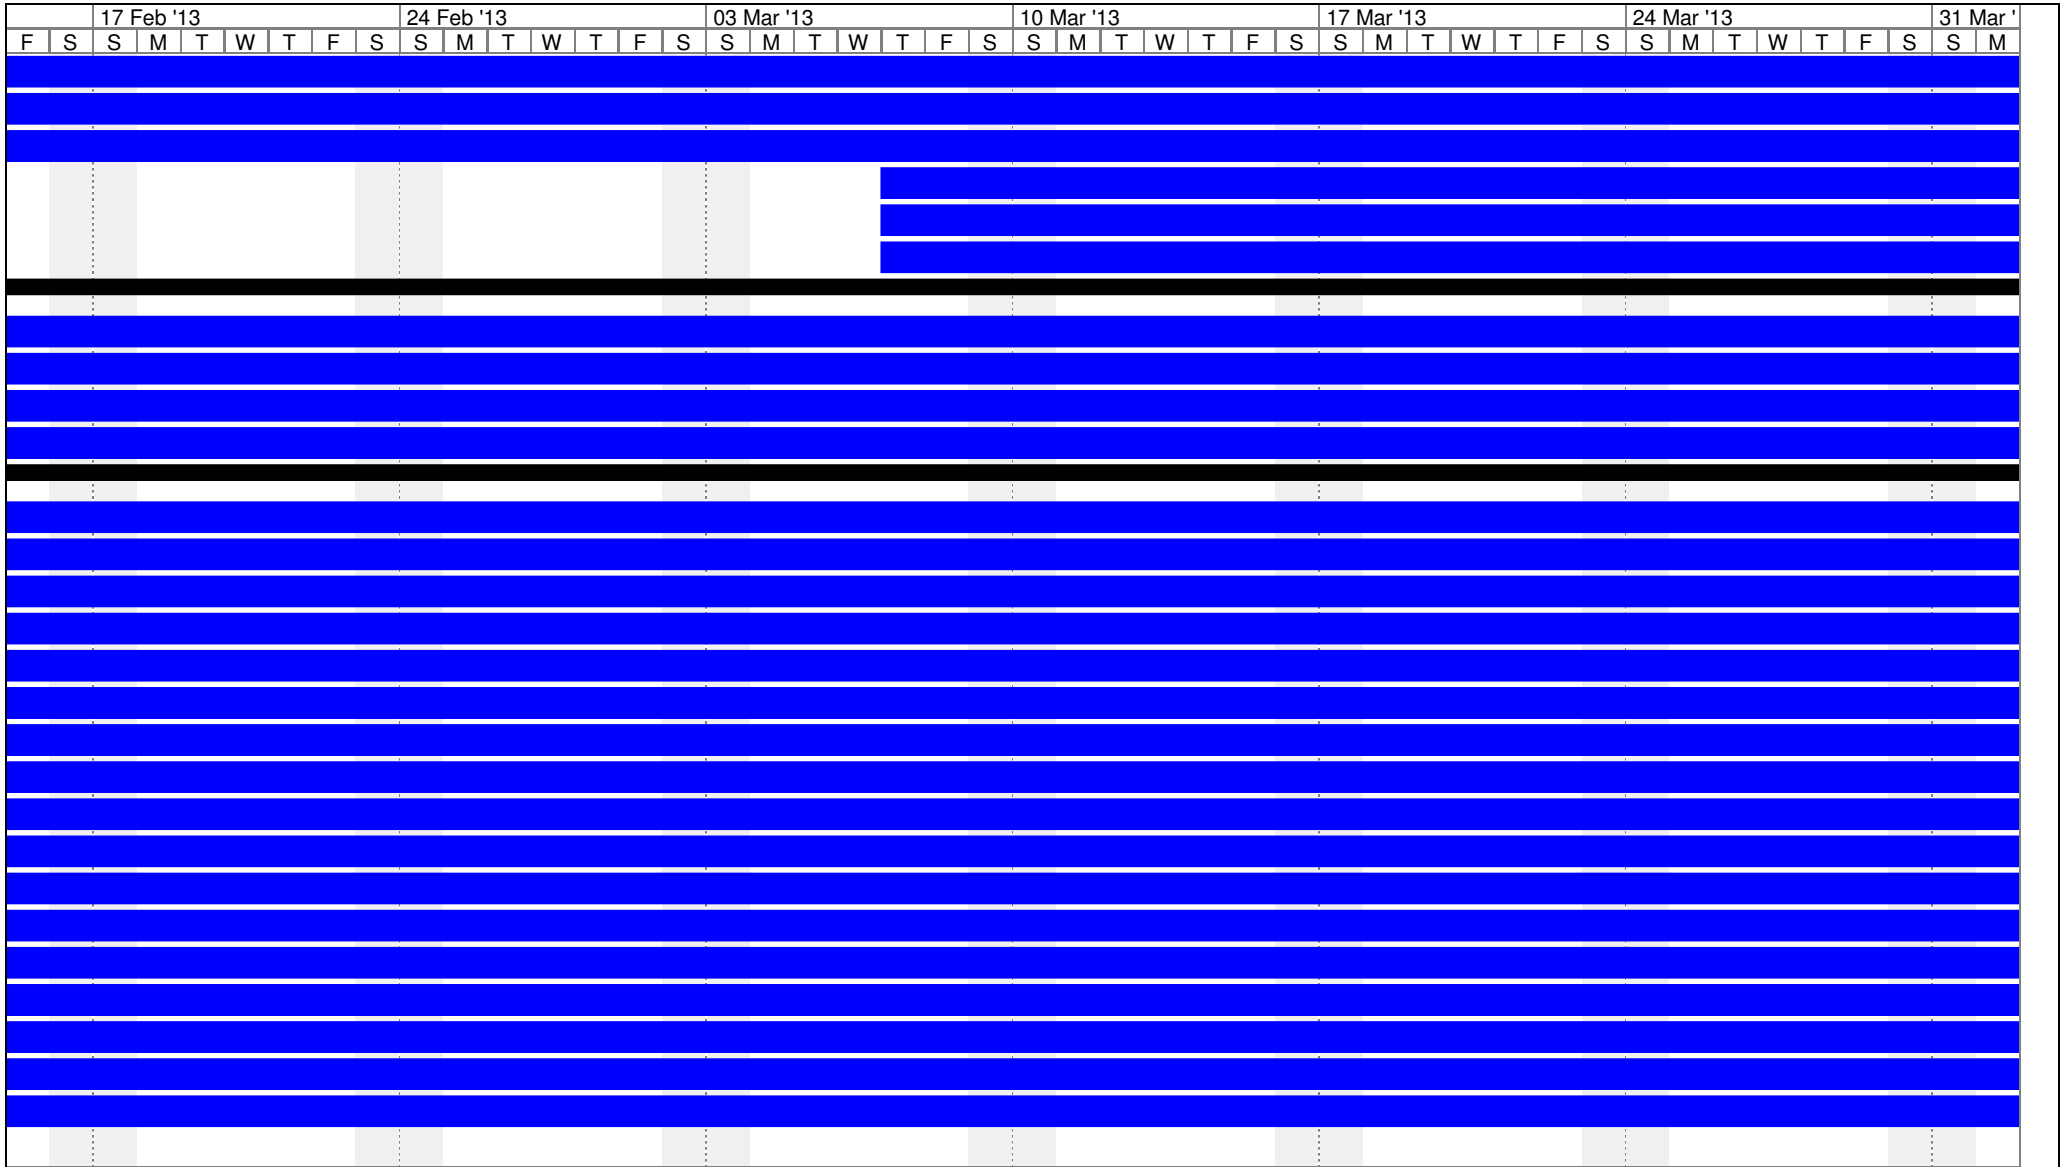


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13







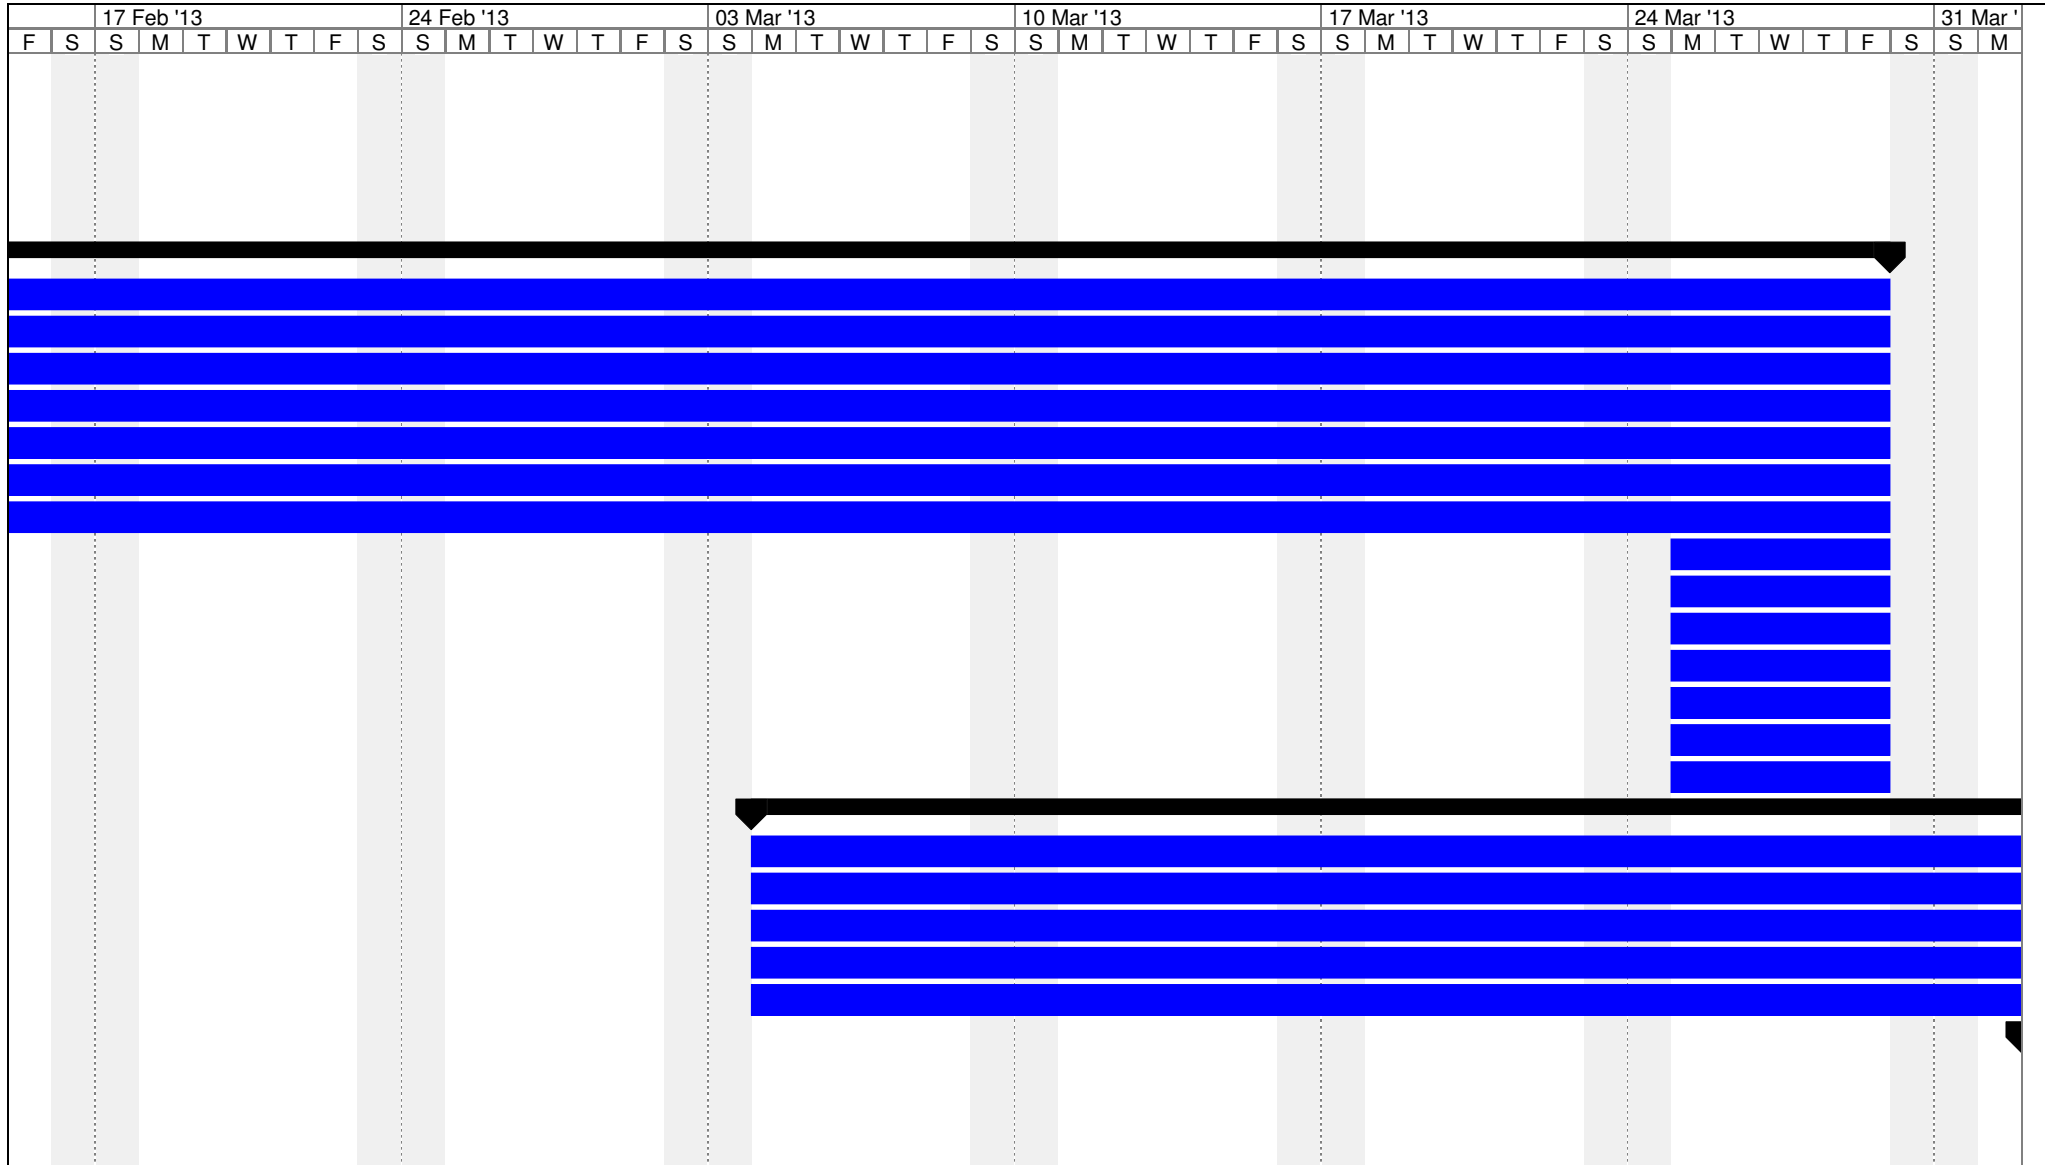


Tarefa 
 Divisão 
 Andamento 

Etapa 
 Resumo 
 Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Data limite 












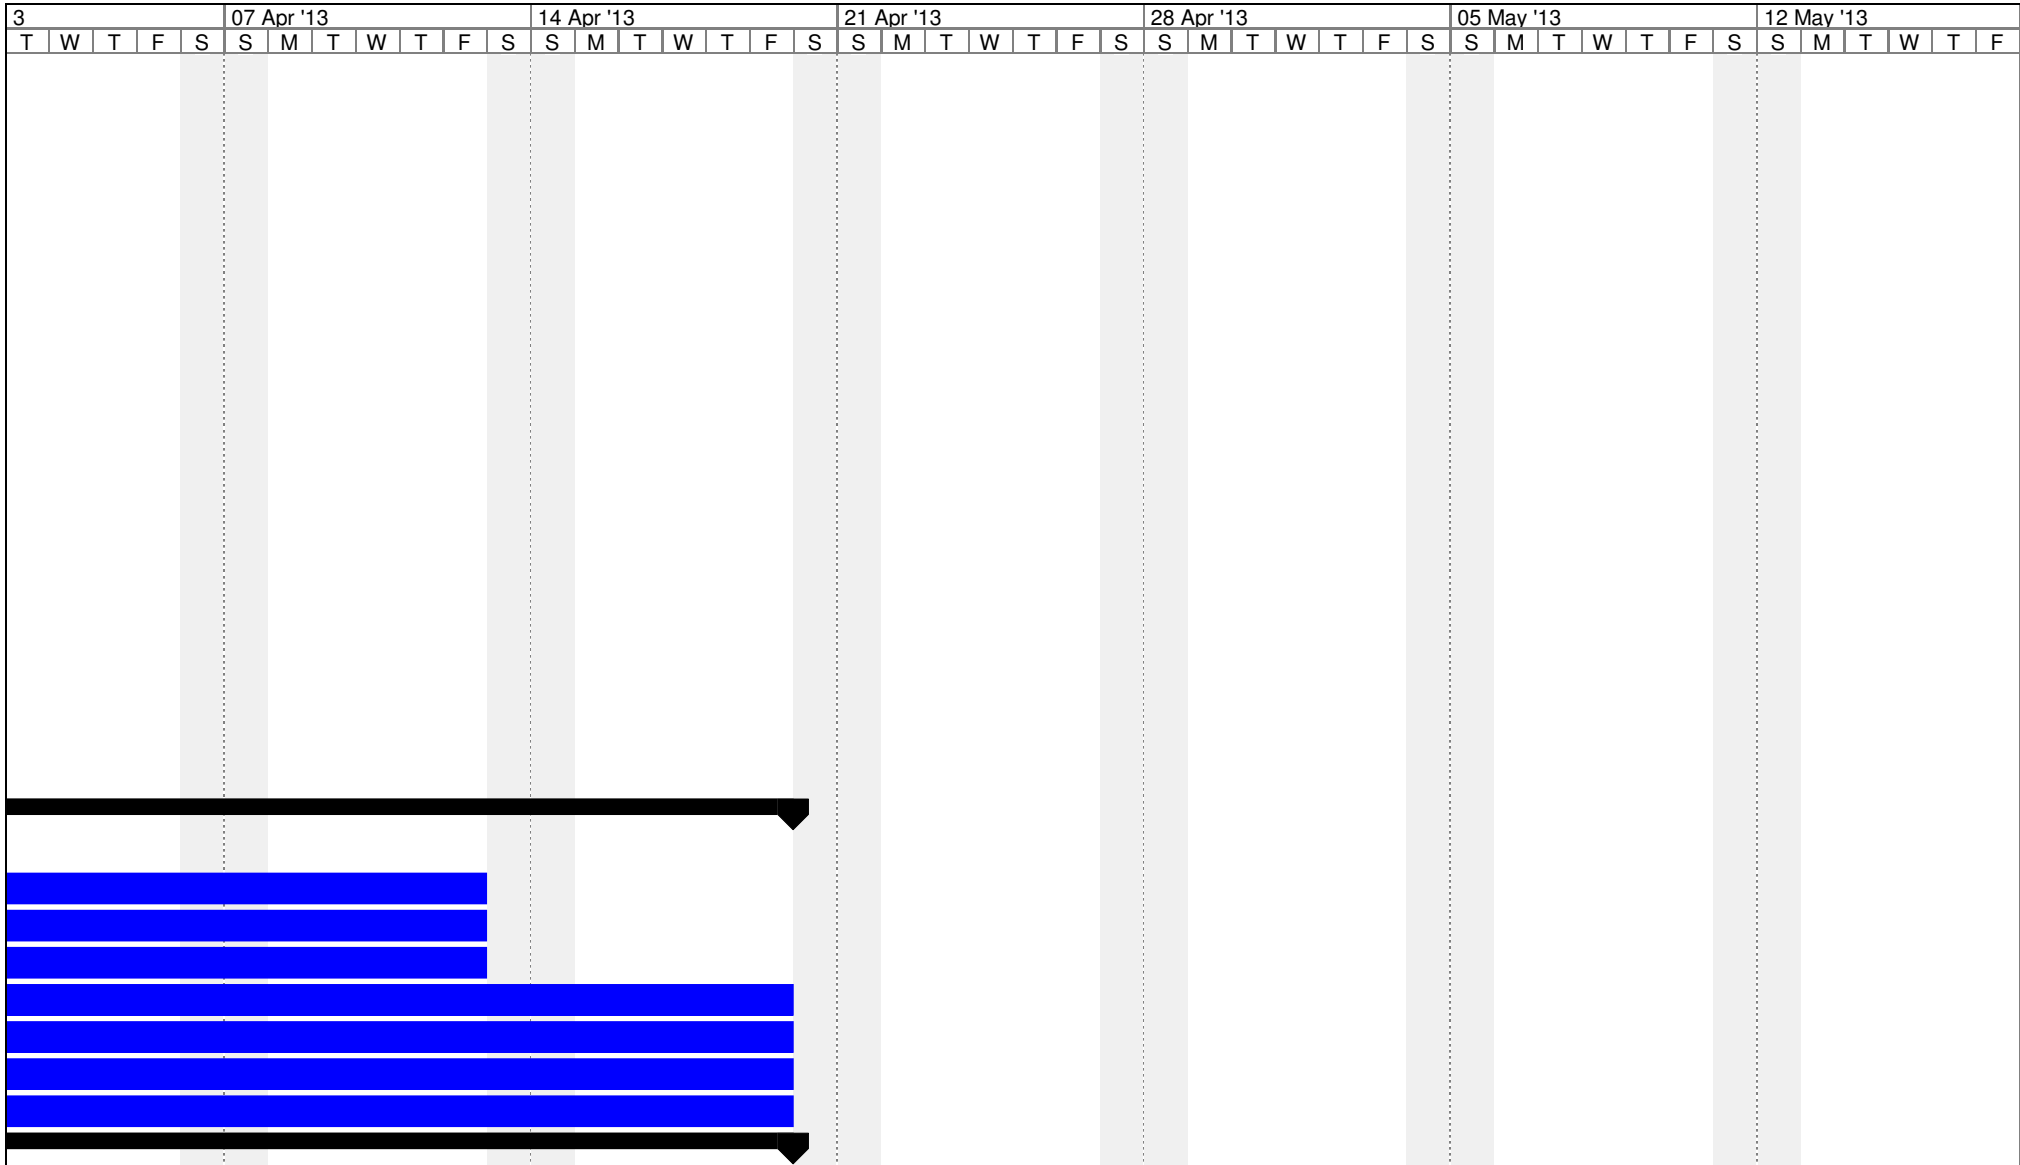
Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	


		17 Feb '13							24 Feb '13							03 Mar '13							10 Mar '13							17 Mar '13							24 Mar '13							31 Mar '13	
F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	




Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

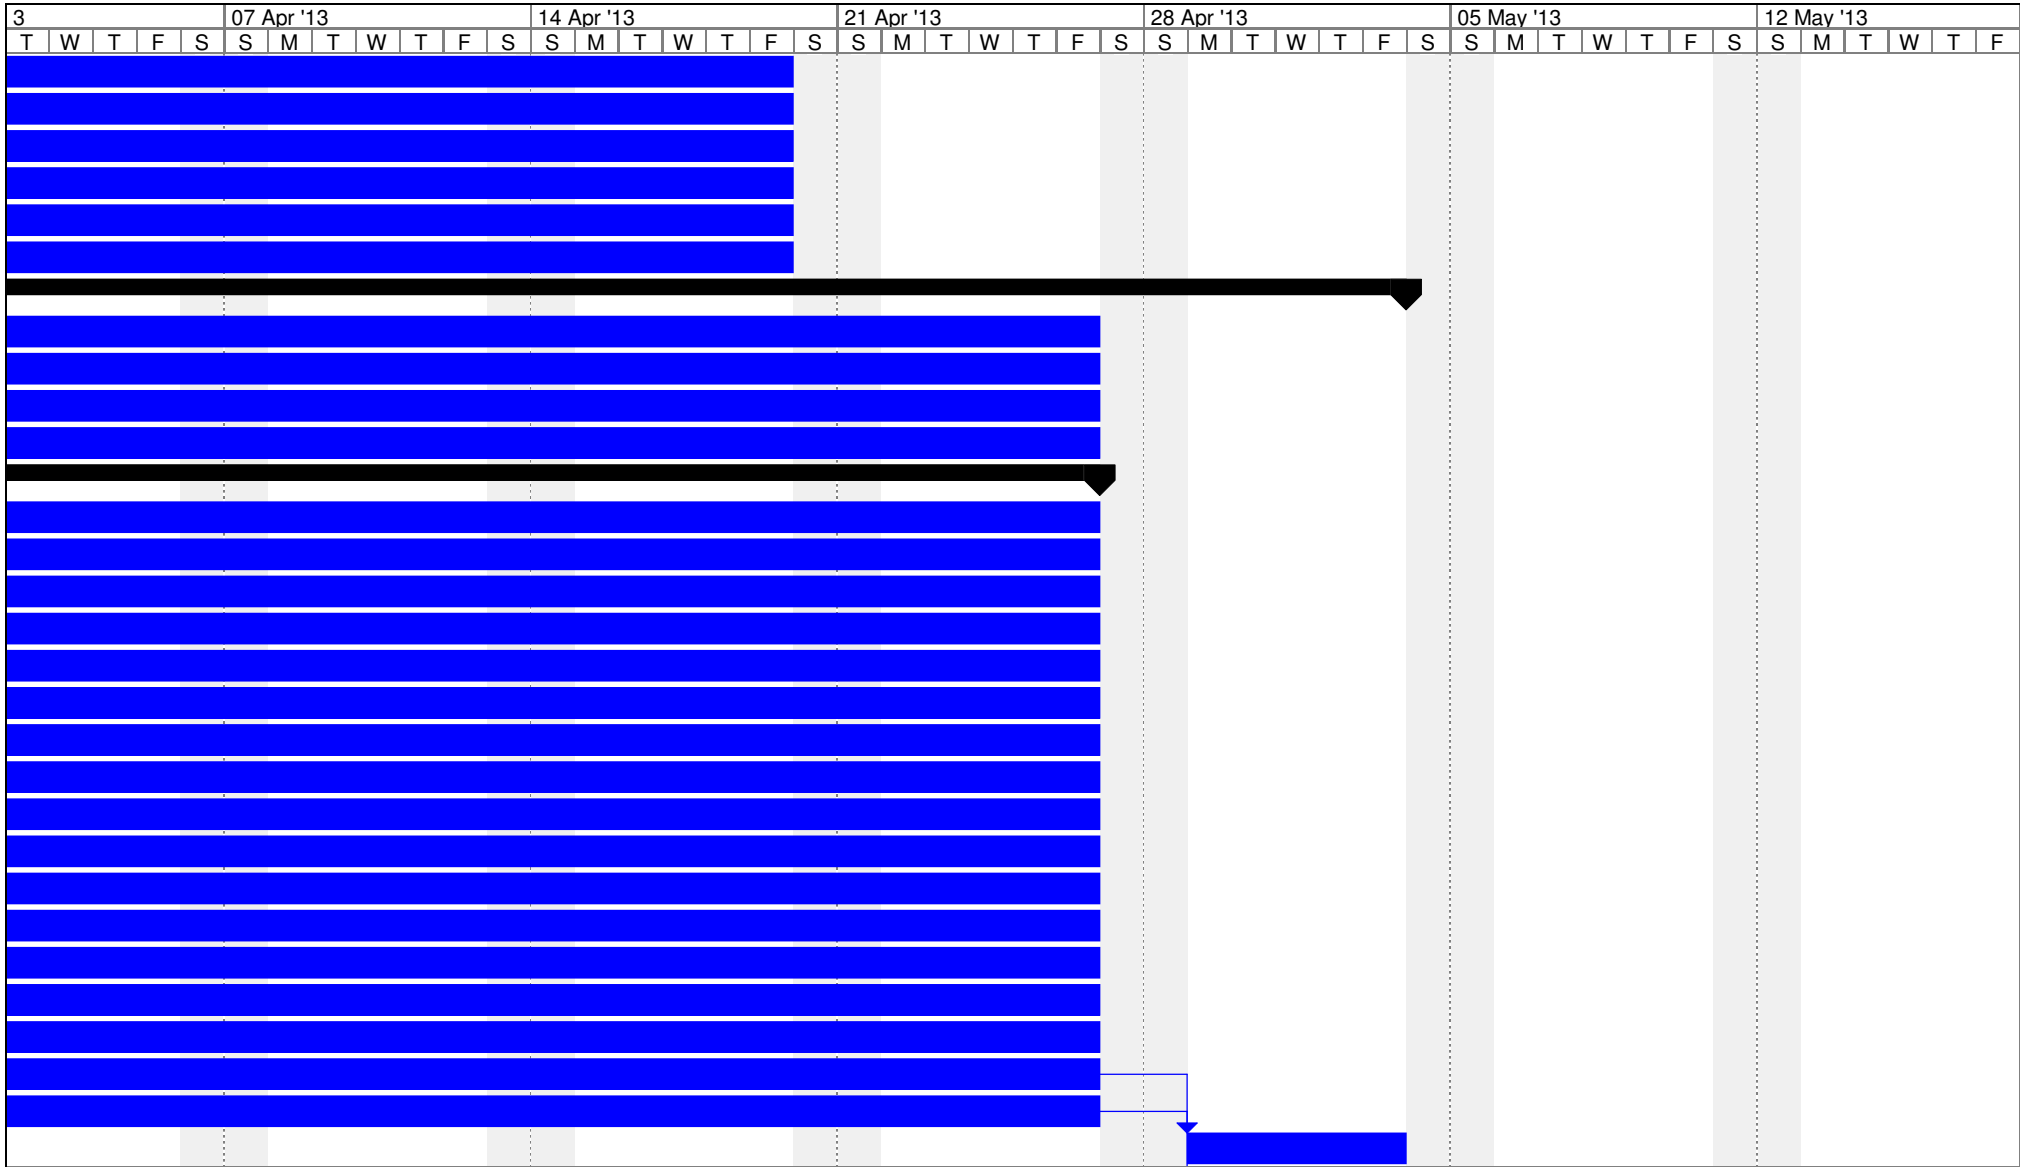

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13



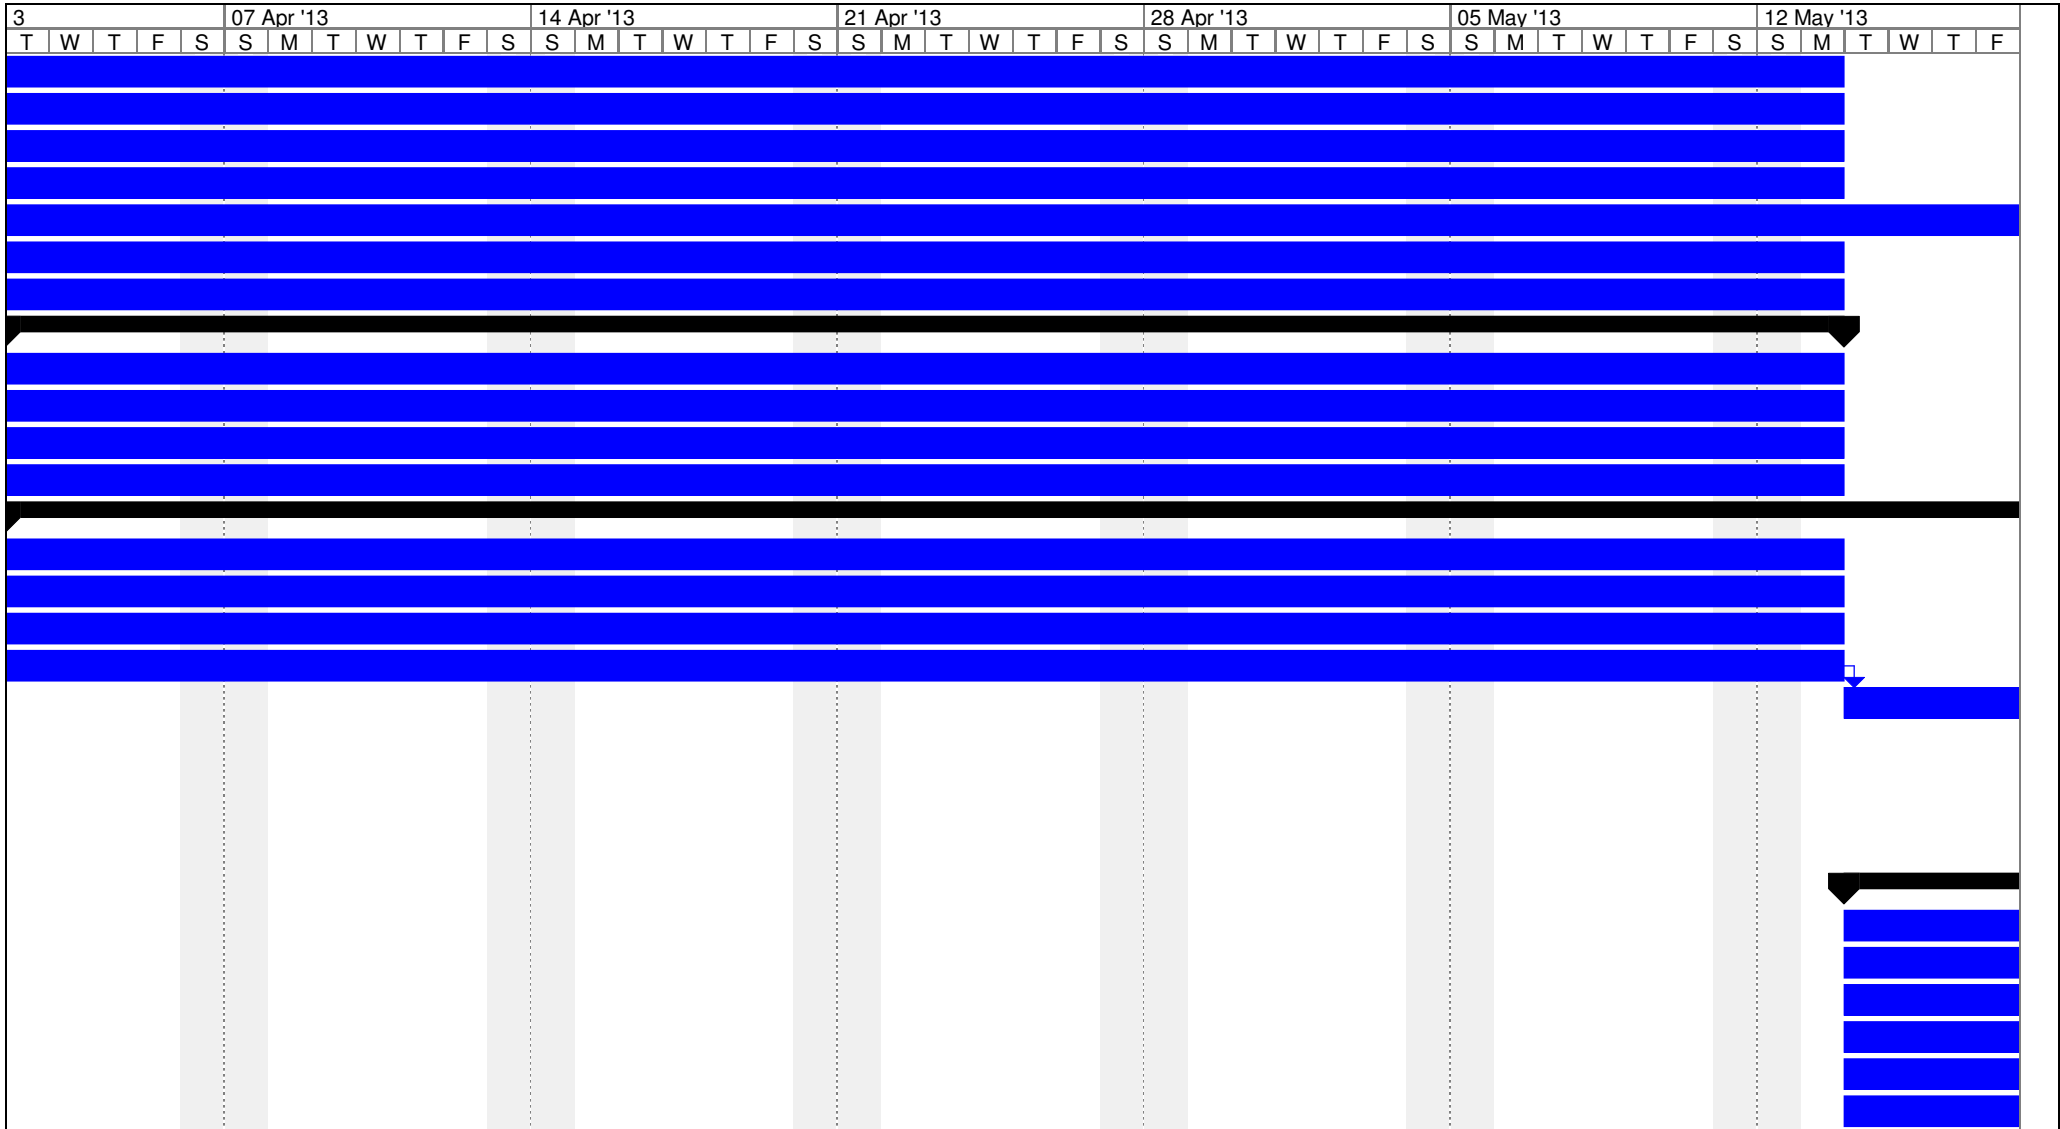






Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	












Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
Divisão		Resumo		Etapa externa	
Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

19 May '13							26 May '13							02 Jun '13							09 Jun '13							16 Jun '13							23 Jun '13							30 Jun '13			
S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	


19 May '13							26 May '13							02 Jun '13							09 Jun '13							16 Jun '13							23 Jun '13							30 Jun '13			
S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	












Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
 Divisão 
 Andamento 










Etapa 
 Resumo 
 Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Data limite 

07 Jul '13				14 Jul '13				21 Jul '13				28 Jul '13				04 Aug '13				11 Aug '13																			
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S								

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

07 Jul '13				14 Jul '13				21 Jul '13				28 Jul '13				04 Aug '13				11 Aug '13																			
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S								

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

07 Jul '13				14 Jul '13				21 Jul '13				28 Jul '13				04 Aug '13				11 Aug '13																			
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S								

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 

Divisão 


Andamento 

Etapa 



Resumo 








Resumo do projeto 

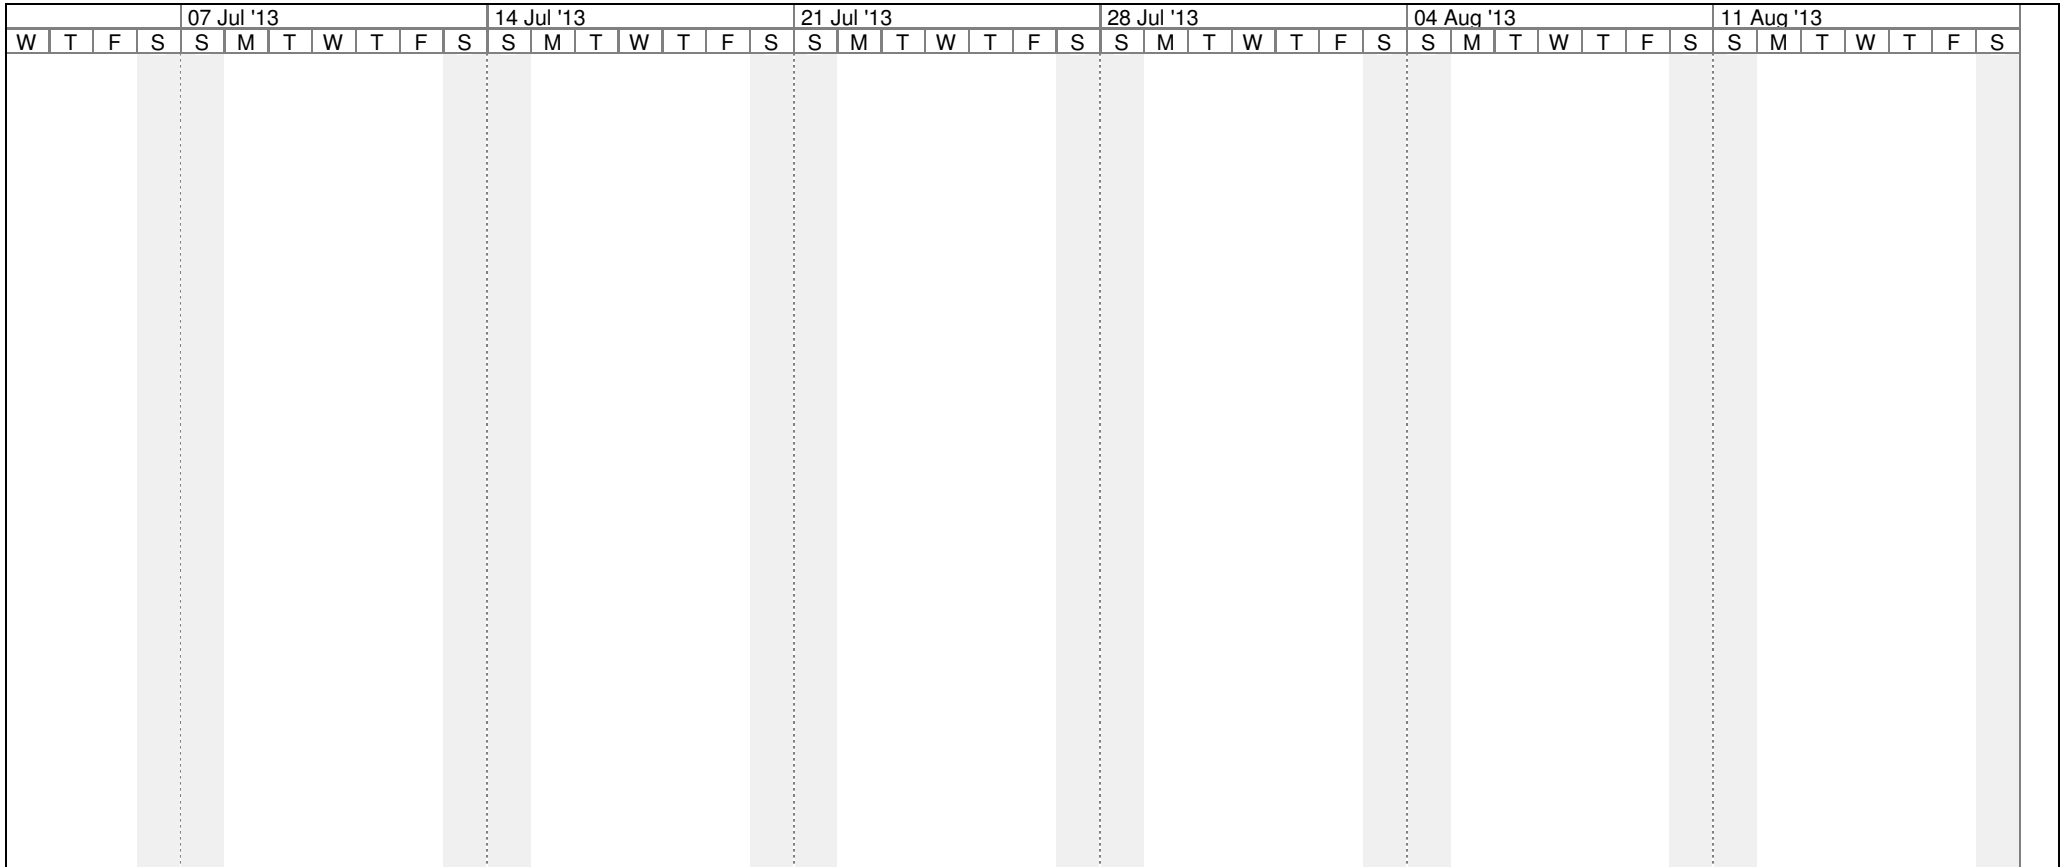Tarefas externas 


Etapa externa 

Data limite 












Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	





18 Aug '13							25 Aug '13							01 Sep '13							08 Sep '13							15 Sep '13							22 Sep '13							29 Sep '13				
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

18 Aug '13							25 Aug '13							01 Sep '13							08 Sep '13							15 Sep '13							22 Sep '13							29 Sep '13			
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

18 Aug '13							25 Aug '13							01 Sep '13							08 Sep '13							15 Sep '13							22 Sep '13							29 Sep '13				
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

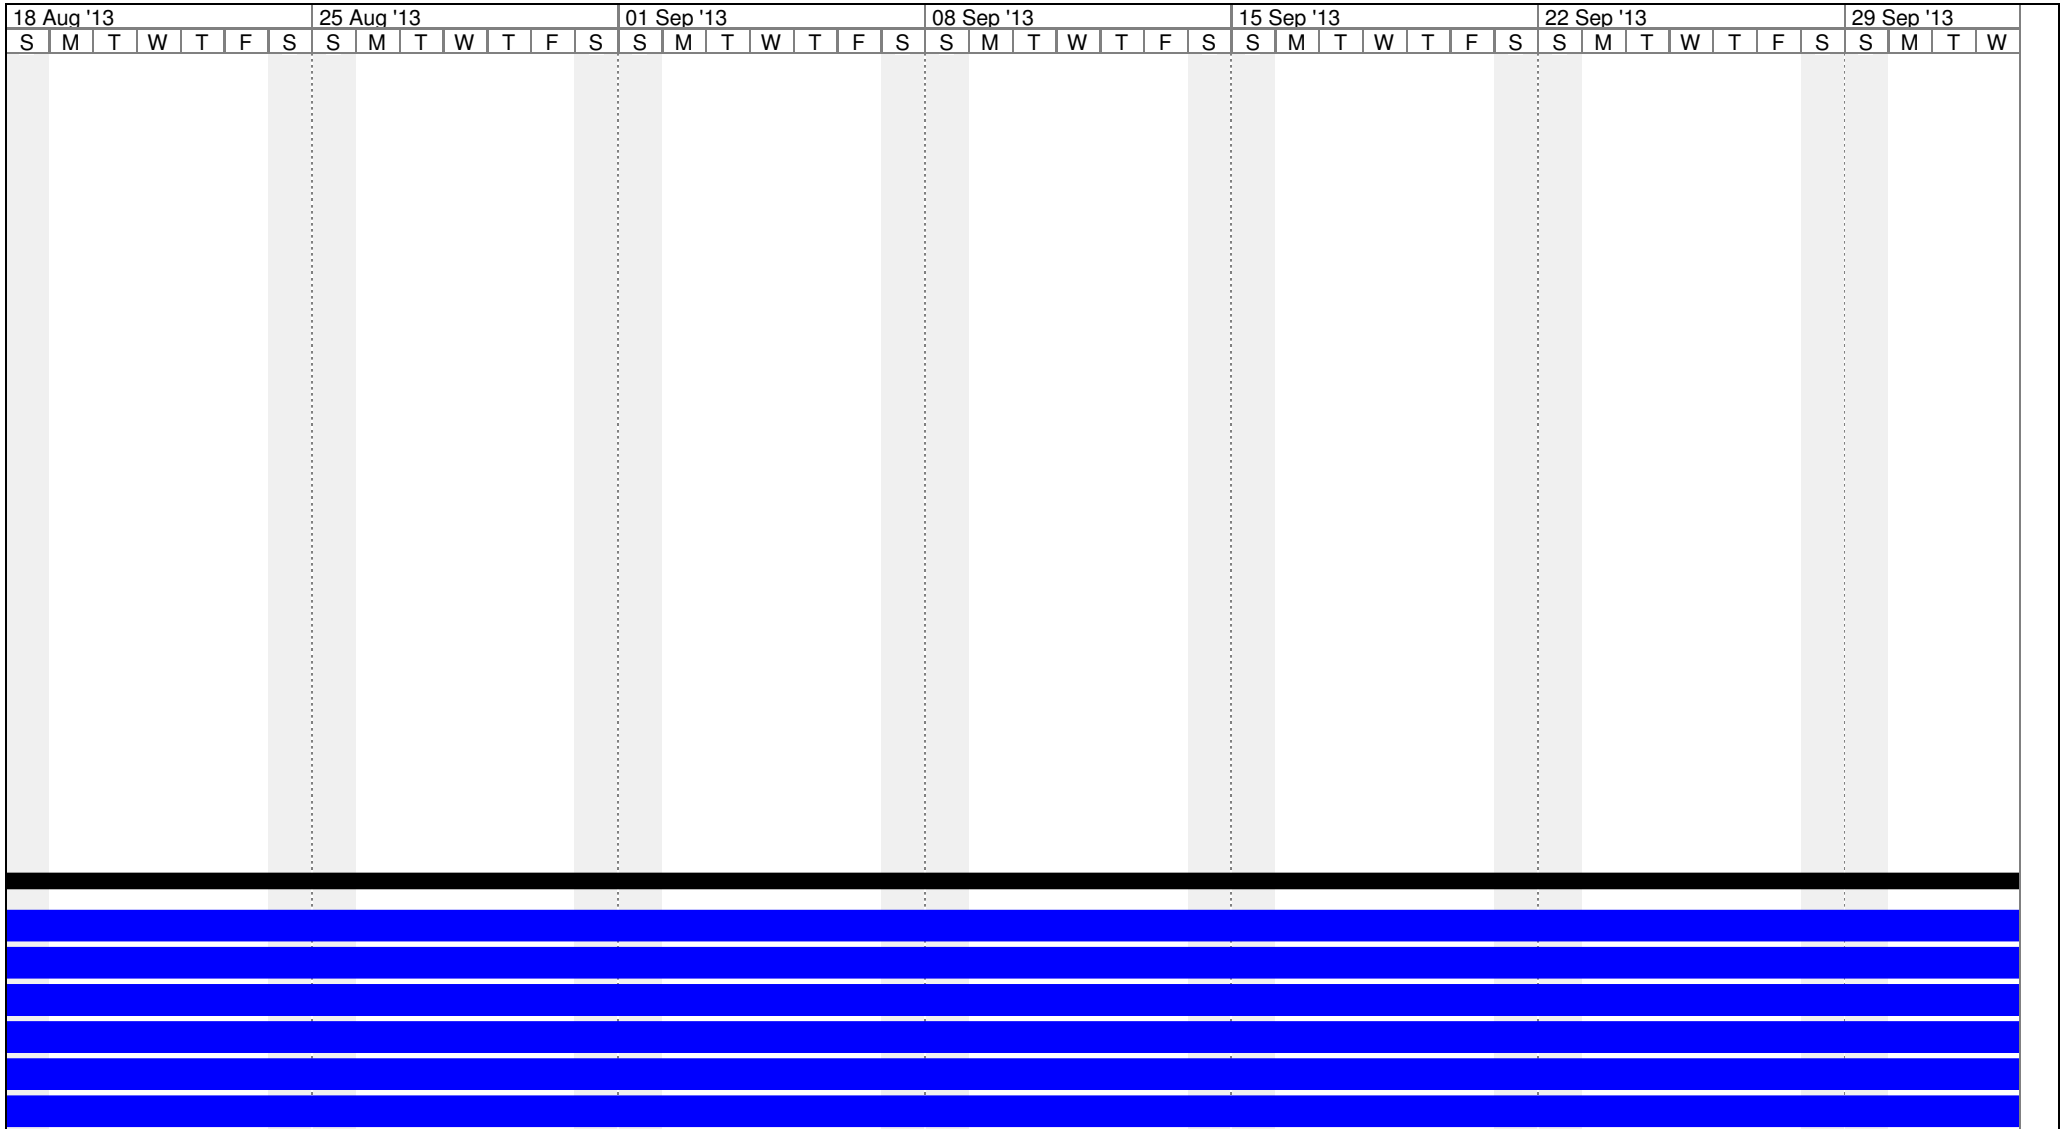










Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma
 Data: Fri 11/01/13

Tarefa 
 Divisão 
 Andamento 










Etapa 
 Resumo 
 Resumo do projeto 

Tarefas externas 
 Etapa externa 
 Data limite 










06 Oct '13			13 Oct '13					20 Oct '13					27 Oct '13					03 Nov '13					10 Nov '13					17										
T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	







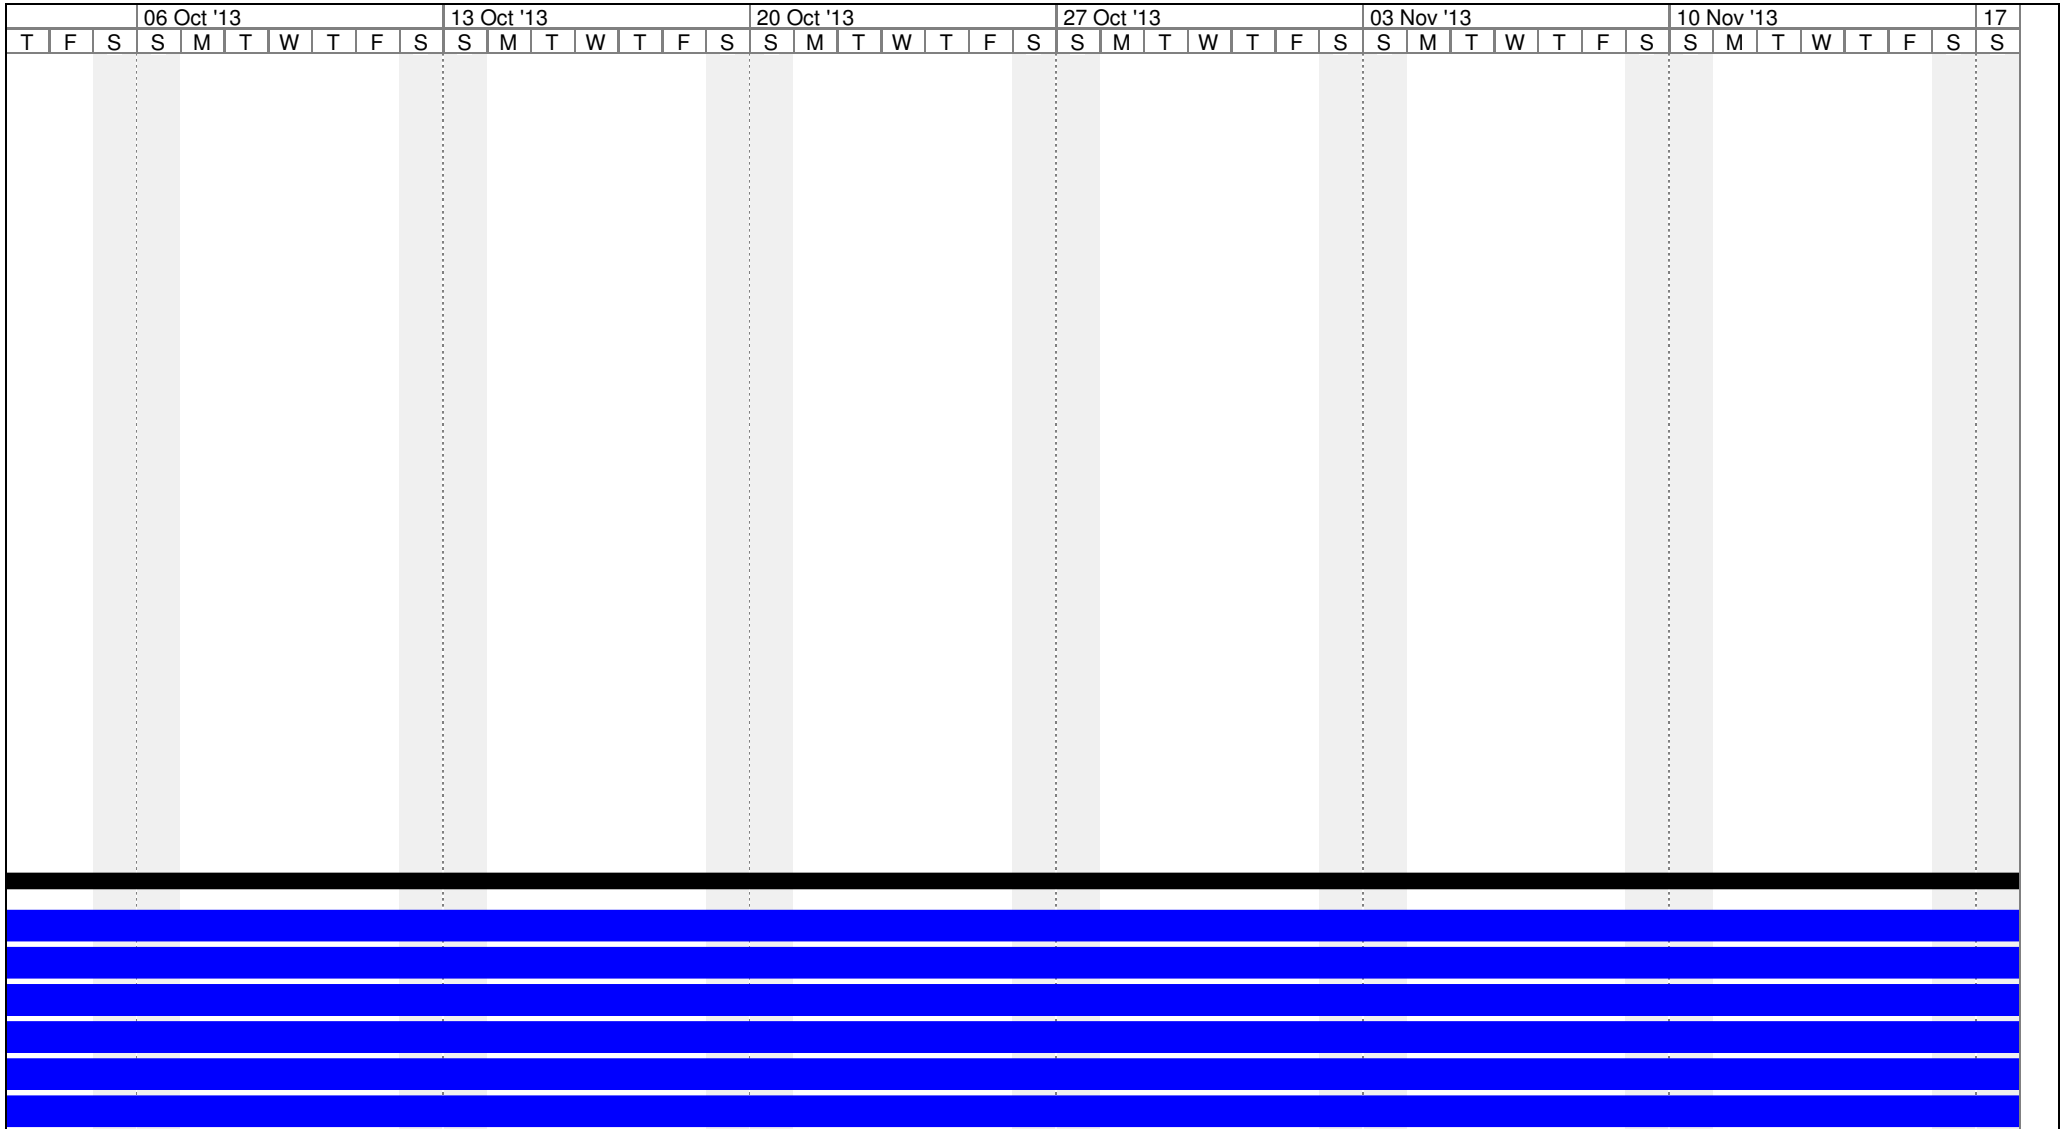


06 Oct '13			13 Oct '13					20 Oct '13					27 Oct '13					03 Nov '13					10 Nov '13					17										
T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	




Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	







Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	





ov '13							24 Nov '13							01 Dec '13							08 Dec '13							15 Dec '13							22 Dec '13							29 Dec '13						
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	


Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

ov '13							24 Nov '13							01 Dec '13							08 Dec '13							15 Dec '13							22 Dec '13							29 Dec '13						
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

ov '13							24 Nov '13							01 Dec '13							08 Dec '13							15 Dec '13							22 Dec '13							29 Dec '13						
M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	

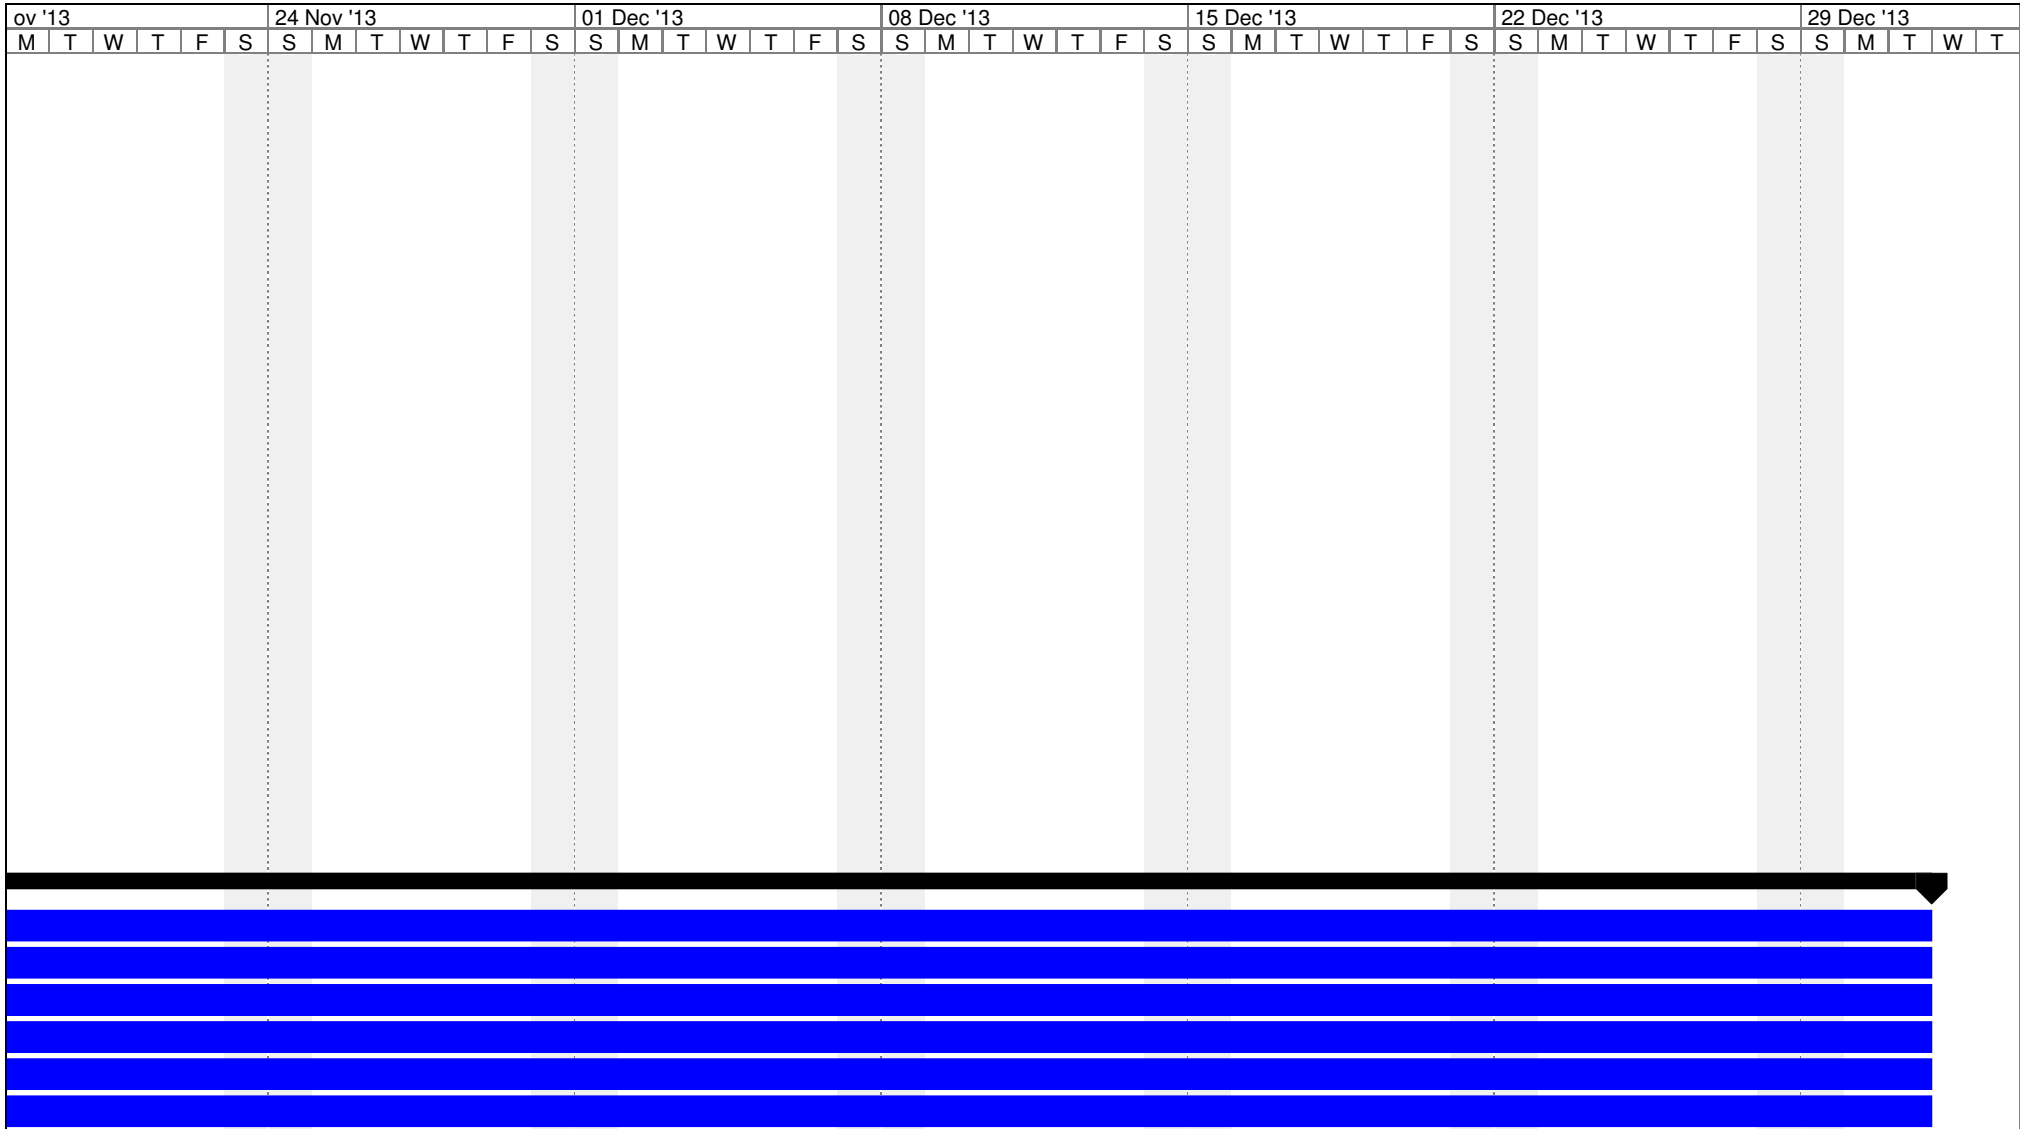

Projeto: SEFAZ BA SAF Cronograma Data: Fri 11/01/13	Tarefa		Etapa		Tarefas externas	
	Divisão		Resumo		Etapa externa	
	Andamento		Resumo do projeto		Data limite	
